


Blok Kütle Çökertme

Operasyonları

için Kısa Aralık Kontrolü ve Filo Yönetimi

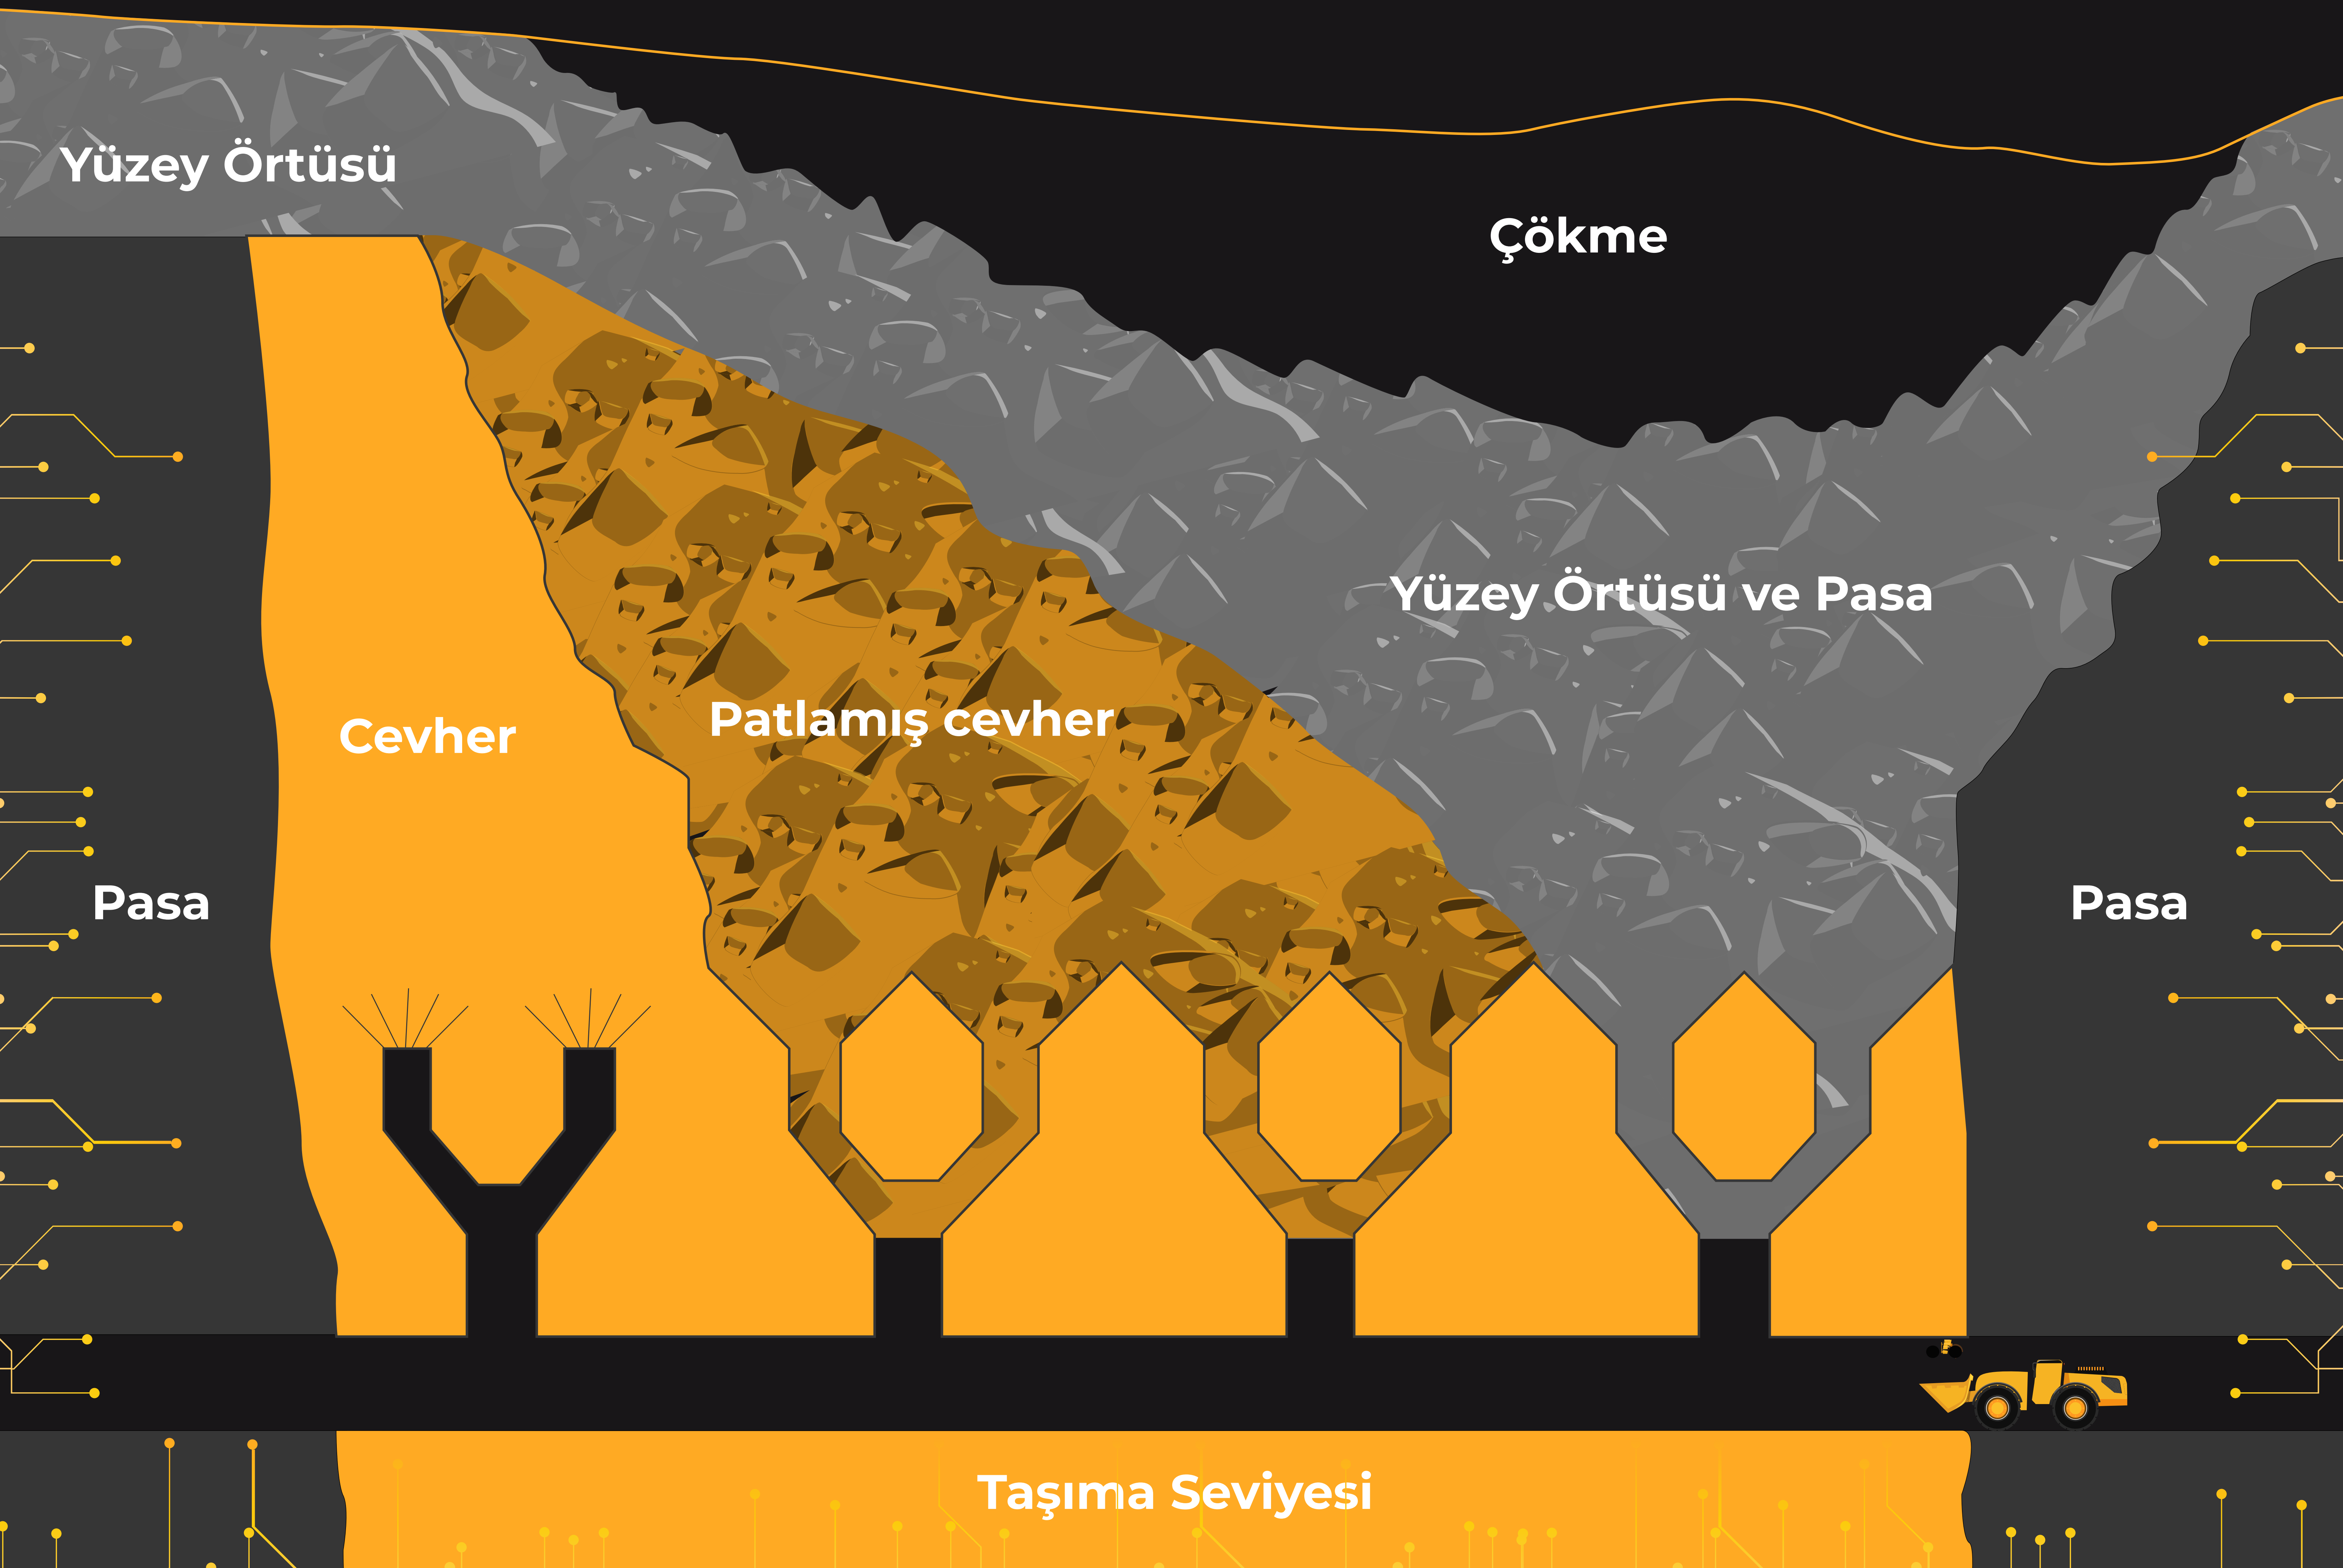

İindekiler

Giriř	02
Blok Ktle kertmenin Yapısı	03
Blok Ktle kertmede Tipik Zorluklar	05
Kısa Aralık Kontrolne Giriř	06
Blok Ktle kertmede Kısa Aralık Kontrol ve Filo Ynetimi	07
Ktle Geliřtirme iin GroundHog	07
GroundHog Kullanımının Sonuları	14
GroundHog Kısa Aralık Kontrol ve Filo Ynetim Sistemi rnek Arayzleri	16
Sonu	20
GroundHog Hakkında	21

Giri 

Madencilik  irketleri, kaynakları verimli bir  ekilde  ıkararak hissedarlara en y ksek getiriyi saėlamayı ama lar. Fiyatların dı sal olarak belirlendiėi bu piyasada, maliyet kontrol  hissedar deėeri i in temel bir etkindir. Bu hedefe ula mak i in madenciler, madencilik s re lerinin farklı a amalarında  e itli stratejik ve taktiksel ara lar kullanabilir. Uygun ko ullarda, blok k tle   kertme, diėer y ntemlere kıyasla d   k i letme maliyetleri sunduėu i in stratejik bir ara tır.

Blok k tle   kertme, genellikle d   k kaliteli cevherleri  ıkarmak i in tercih edilir ve yer  ekimi kullanılarak, a ık ocak madenciliėiyle ula ılamayacak kadar derindeki b   k, eklemlili ve kırıklı cevher k tleleri i lenir. Geleneksel stope madenciliėine g re  ok daha d   k maliyetli olan bu y ntem, aynı zamanda daha y ksek  retim oranları saėlar. Ancak, bu y ntemin zorluėu, operasyonların b   kl ė  nedeniyle ba langı  sermaye maliyetlerinin diėer yeraltı madenciliėi y ntemlerine g re  ok daha y ksek olmasıdır. B   k  l ekli blok k tle   kertme  rnekleri arasında Rio Tinto'nun Northparkes bakır madeni, Freeport'un Grasberg, Newcrest'in Cadia East, Ridgeway Deeps ve Wafi-Golpu, Oyu Tolgoi, Codelco'nun Mina Chuquicamata Subterr nea ve El Teniente, ile New Gold'un New Afton madenleri sayılabilir.



Blok K t le   k rtmenin Yapısı


Blok k t le   k rtmede, geni  bir kaya k tlesini alttan oyularak yapay bir bo luk olu turulur ve bu bo luk,   kerken kendi kırıklarıyla dolar. Kırılan cevher,  nceden hazırlanmış huni ve erişim t nellerine d  er. Bu maden yapıları,   ken cevherden korunmak i in sığınak benzeri bir kaya k tlesinde yer alır ve madenciler buradan cevheri s rekli   karır.   kme, cevher k tlesini boyunca yukarı do ru ilerler ve sonunda y zeyde geni  alanların   kerek obruklar olu turmasına yol a ar. Blok k t le   k rtme operasyonları iki a amadan olu ur: geli tirme ve  retim. Sermaye maliyetlerinin  o u geli tirme a amasında ortaya  ıkar. Bu a amada, entegre bir Kısa Aralık Kontrol sistemi ve yerle ik Filo Y netim sistemi,  alı ma y zeyinin daha hızlı, g venli ve d   k maliyetle ilerlemesini sa layarak b y k avantajlar sunar.

Geli tirme A aması

Bu a amada madencilik faaliyetlerinin  o u, bir stope madeninin  retim a amasına benzer şekilde, moloz toplama-delme-patlatma d ng s n  i erir. Ancak, her d ng  farklı g revler gerektirebilir ve ko ullara veya konuma ba lı olarak d ng  uzayabilir. Alttan oyulma ve  ekme  anlarının olu turulması s recinde, faaliyetler bir d ng den ziyade tekil adımlar halinde daha uzun s rebilir. Alttan oyulma, patlatılmadan  nce delinir ve moloz toplanmaz;  ekme  anları da benzer şekilde i lenir.

 retim A aması

Bir  retim stope madenindeki moloz toplama-delme-patlatma d ng s n  referans olarak, alttan oyulmanın patlatılması ve   kertilmesi, bu d ng n n delme ve patlatma kısımlarını yerine getirir. Bu nedenle, birincil par alanma yer  ekimi, cevher k tlesinin a ırlı ı ve stres yayılımı tarafından ger ekle tirilir. Geriye yalnızca  ekme noktalarından d zenli ve planlı moloz toplama kalır. İkincil patlatma ve  ekme noktası bakımı gibi ek faaliyetler moloz toplamayı destekler, ancak ana faaliyet,  ekme kontrol programına g re belirli bir tempo ve konumlarda yapılan moloz toplama dır.

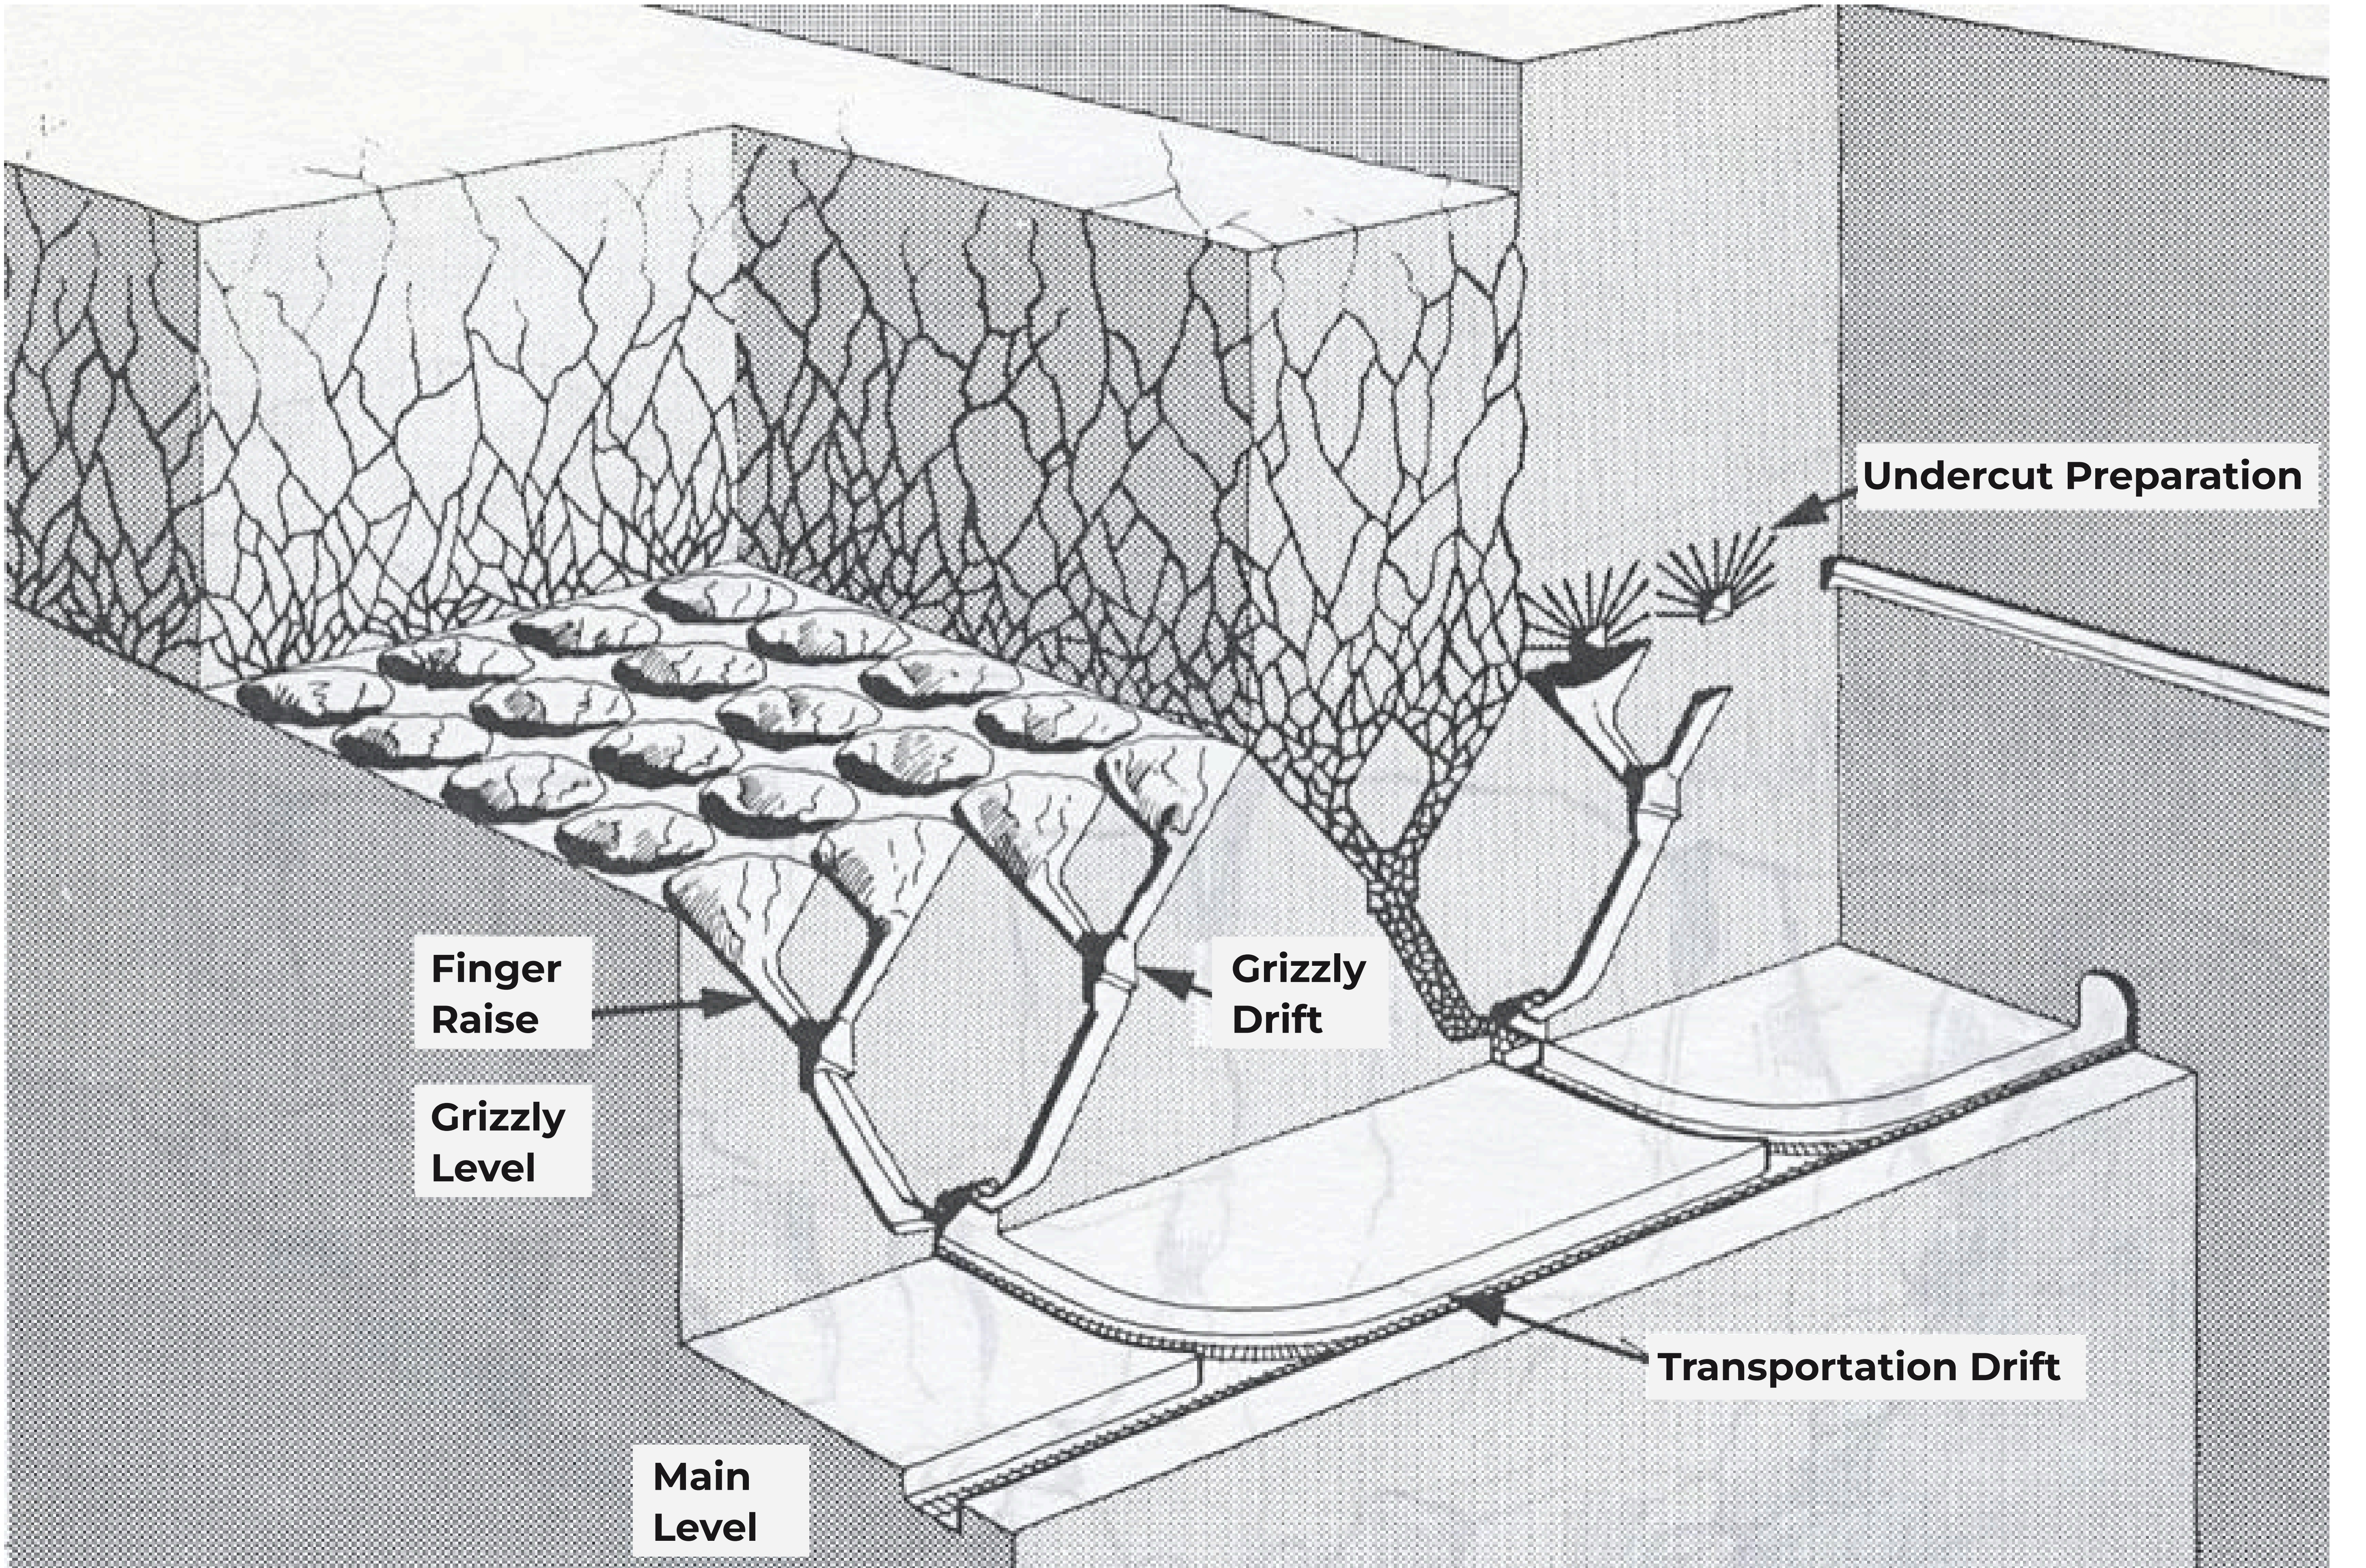

Blok K tle   kertmede Tipik Zorluklar

Her madencilik y nteminde olduėu gibi, blok k tle   kertme de  e itli zorluklarla kar ıla ır.   kertme s recinin kendisi ve  ekme noktalarının  zerindeki olaylar hakkında sınırlı bilgi vardır. Bu,   kme ilerlemesi, cevher/atık oranı, par alanma durumu ve su giri leri gibi konuları kapsar. Sens rler ve enstr mantasyon sınırlı veri saėlar, ancak ger ek durum yalnızca g rsel g zlemler ve ilgili verilerle tahmin edilebilir. Verilerin zamanında toplanması ve hızlı analizi, gerekli m dahaleler i in ilk savunma hattını olu turur. Sapmalara hızlı tepki vermek, olumsuz etkileri azaltır.


Bir diėer zorluk, zamanla erozyon ve stres birikimi nedeniyle bozulan  ekme noktalarının izlenmesi ve bakımındır.  zellikle   kme cephesi  ekme noktasının  zerinden ge tiėinde, stresin hızlı aktarımı bu sorunu artırır.  ekme noktaları sens rlerle donatılabilir ve veriler d zenli analiz edilebilir, ancak herhangi bir m dahale kararı  ncesi  ekme noktası denetimi gerekir.

Blok k tle   kertmenin geli tirilmesi i in gereken uzun s re ve y ksek maliyet, bu fakt rlerden birinin azaltılmasının proje ekonomisine fayda saėlayacaėını g sterir. Geli tirme d ng s ndeki gereksiz beklemleri optimize etme veya kaldırma, moloz toplama-delme-patlatma d ng s n  hızlandırır ve geli tirme a amasını kısaltır. Bu, gelir getiren  retim a amasına daha erken ge i  saėlar.

 retimde, gereksiz beklemlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması doėrudan ekonomik kazanç saėlar. Ekipman ve personelin daha verimli kullanımı tonajı artırır. Faaliyetlerin ve g revlerin planlanması, program sapmalarına zamanında m dahale edilmesi, operasyonun temel s r c lerini ve performans g stergelerini (KPI'lar) en  st d zeye  ıkarır.

Kısa Aralık Kontrol ne Giri 

Kısa Aralık Kontrol n n (SIC) temel ilkesi a ıktır: Ge mi ten   renerek gelece i iyile tirmek. Uygulamada, SIC,  n saha ekipleri tarafından her iki ila d rt saatte bir yapılan kısa, odaklı incelemelerden olu ur. Ekipler, madencilik d ng s ndeki kayıplara yol a an gecikmeleri de erlendirir ve gelecekteki performansı artıracak eylemleri belirler. Vardiya sırasında planlanan ve ger ek  retim birden fazla kez incelenmesi, s perviz rlerin vardiya ortasında d zeltici  nlemler alarak  retim etkinli ini ve verimlili ini artırmasını sa lar. Her vardiya, s perviz rlerin verileri kullanarak  retim ve varlık kullanımını iyile tirme fırsatlarını tespit etti i kısa aralıklara b l n r. Bazı durumlarda, bu eylemler mevcut veya yeni ortaya  ıkan sorunları  nler. Fabrika ortamında uzun s redir kullanılan SIC,  n saha karar alma ve kaynak tahsisini destekleyerek bir vardiya i inde sonu ları optimize eder. Ba arılı bir SIC tabanlı  retim kontrol ve filo y netim sistemi, geleneksel sistemlere g re  ok sayıda fayda sa lar:

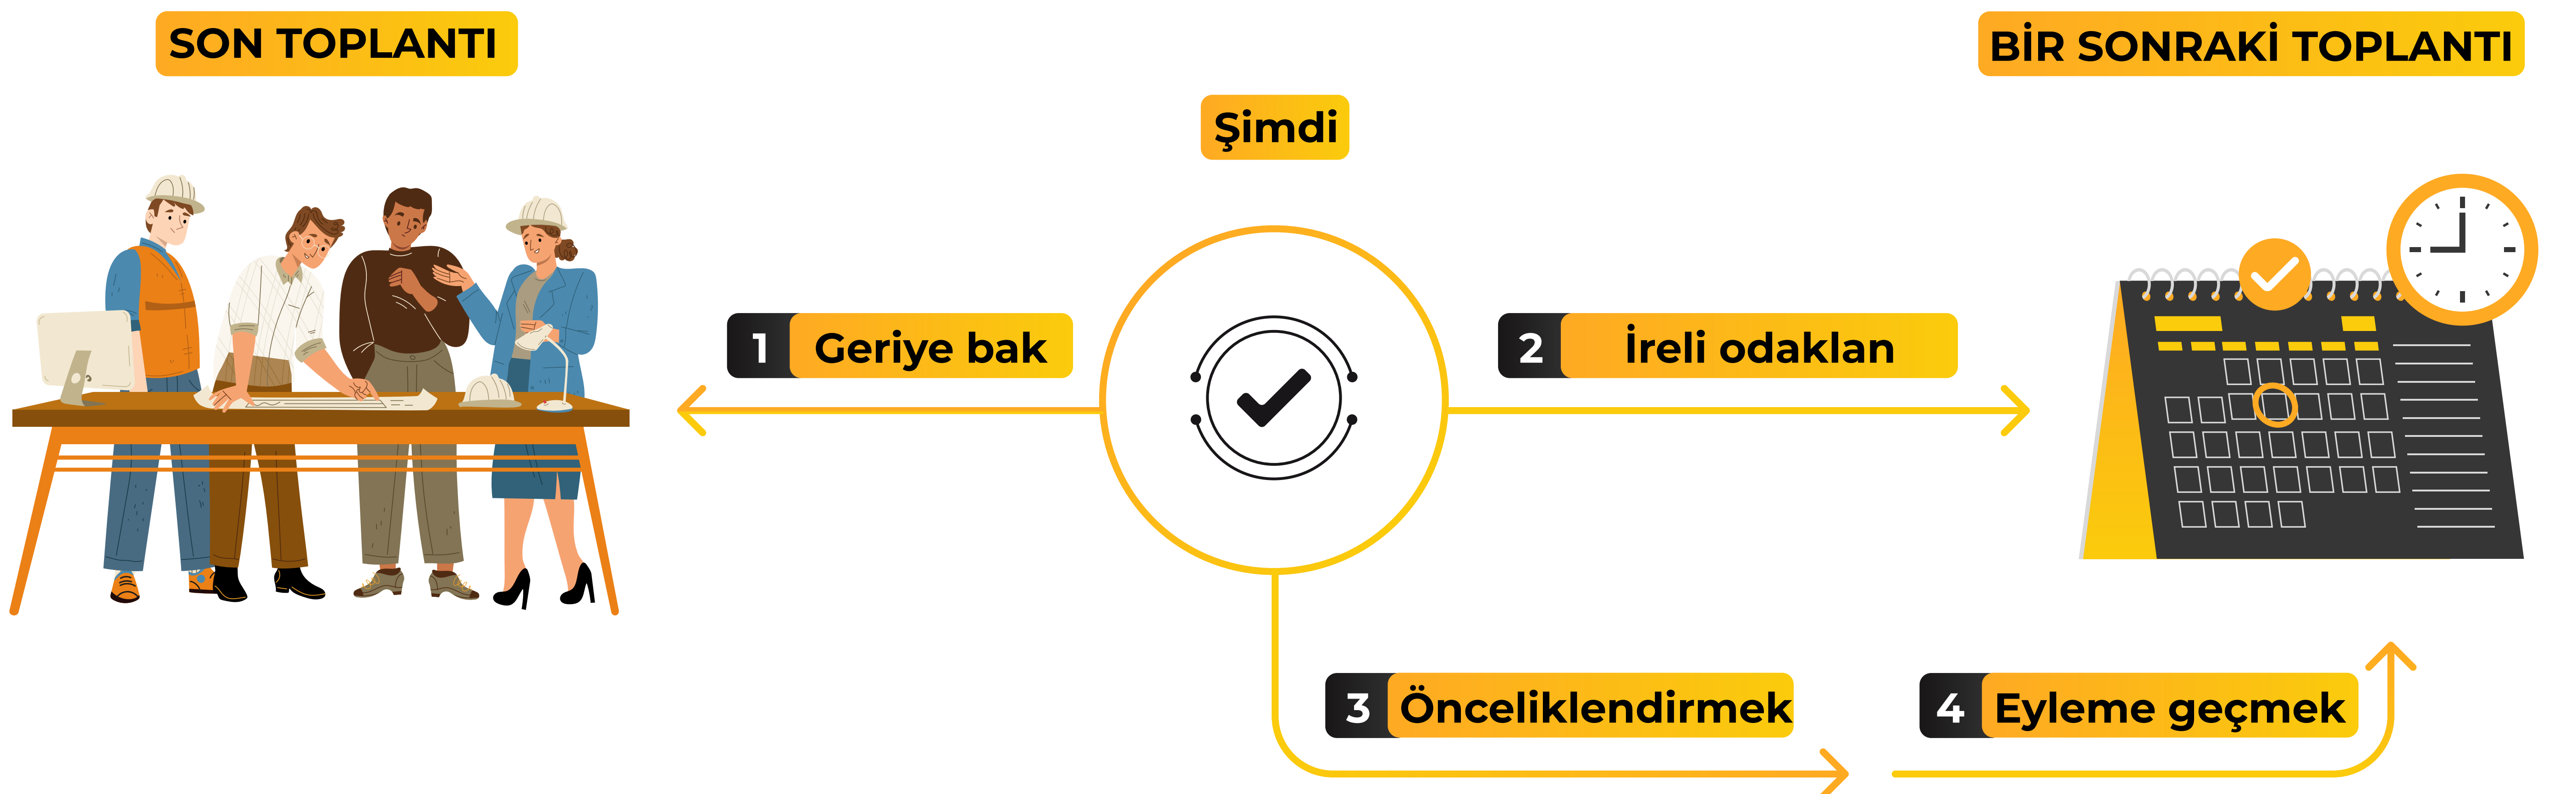


1. Üretim hedeflerini planlama ve gerçekleşen üretimi gerçek zamanlı izleme.
2. Gecikmeleri takip etme ve üretim üzerindeki etkilerini azaltmak için ekip faaliyetlerini önceden ayarlama.
3. Çalışma yüzeyindeki madencilik yoğunluğunu ve faaliyetleri en üst düzeye çıkarma.
4. Vardiya içindeki acil gecikmelere odaklanarak Genel Ekipman Etkinliğini (OEE) artırma.
5. Çalışan bağlılığını ve ekip sorumluluğunu güçlendirme.

Blok Kütle Çökertmede Kısa Aralık Kontrolü ve Filo Yönetimi

GroundHog'un SIC ve filo yönetim platformu, kullanıcı dostu tasarımı, sağlam yapısı ve blok kütle çökertme operasyonlarına uygunluğuyla öne çıkar. GroundHog, geliştirme ve üretim aşamaları için önceden hazırlanmış programlama şablonlarıyla gelir. GroundHog'un başlık ve çekme çanı yönetim sistemi, maden planlayıcıları ve süpervizörlerin programlamayı etkili bir şekilde yönetmesini sağlar.

Kütle Geliştirme için GroundHog

Blok kütle çökertme madeninin geliştirme faaliyetleri için GroundHog, drift-and-fill madenciliğindeki moloz toplama-delme-patlatma döngülerinde kanıtladığı rehberlik, üretkenlik artışı ve verimlilik kazanımlarını sunar.

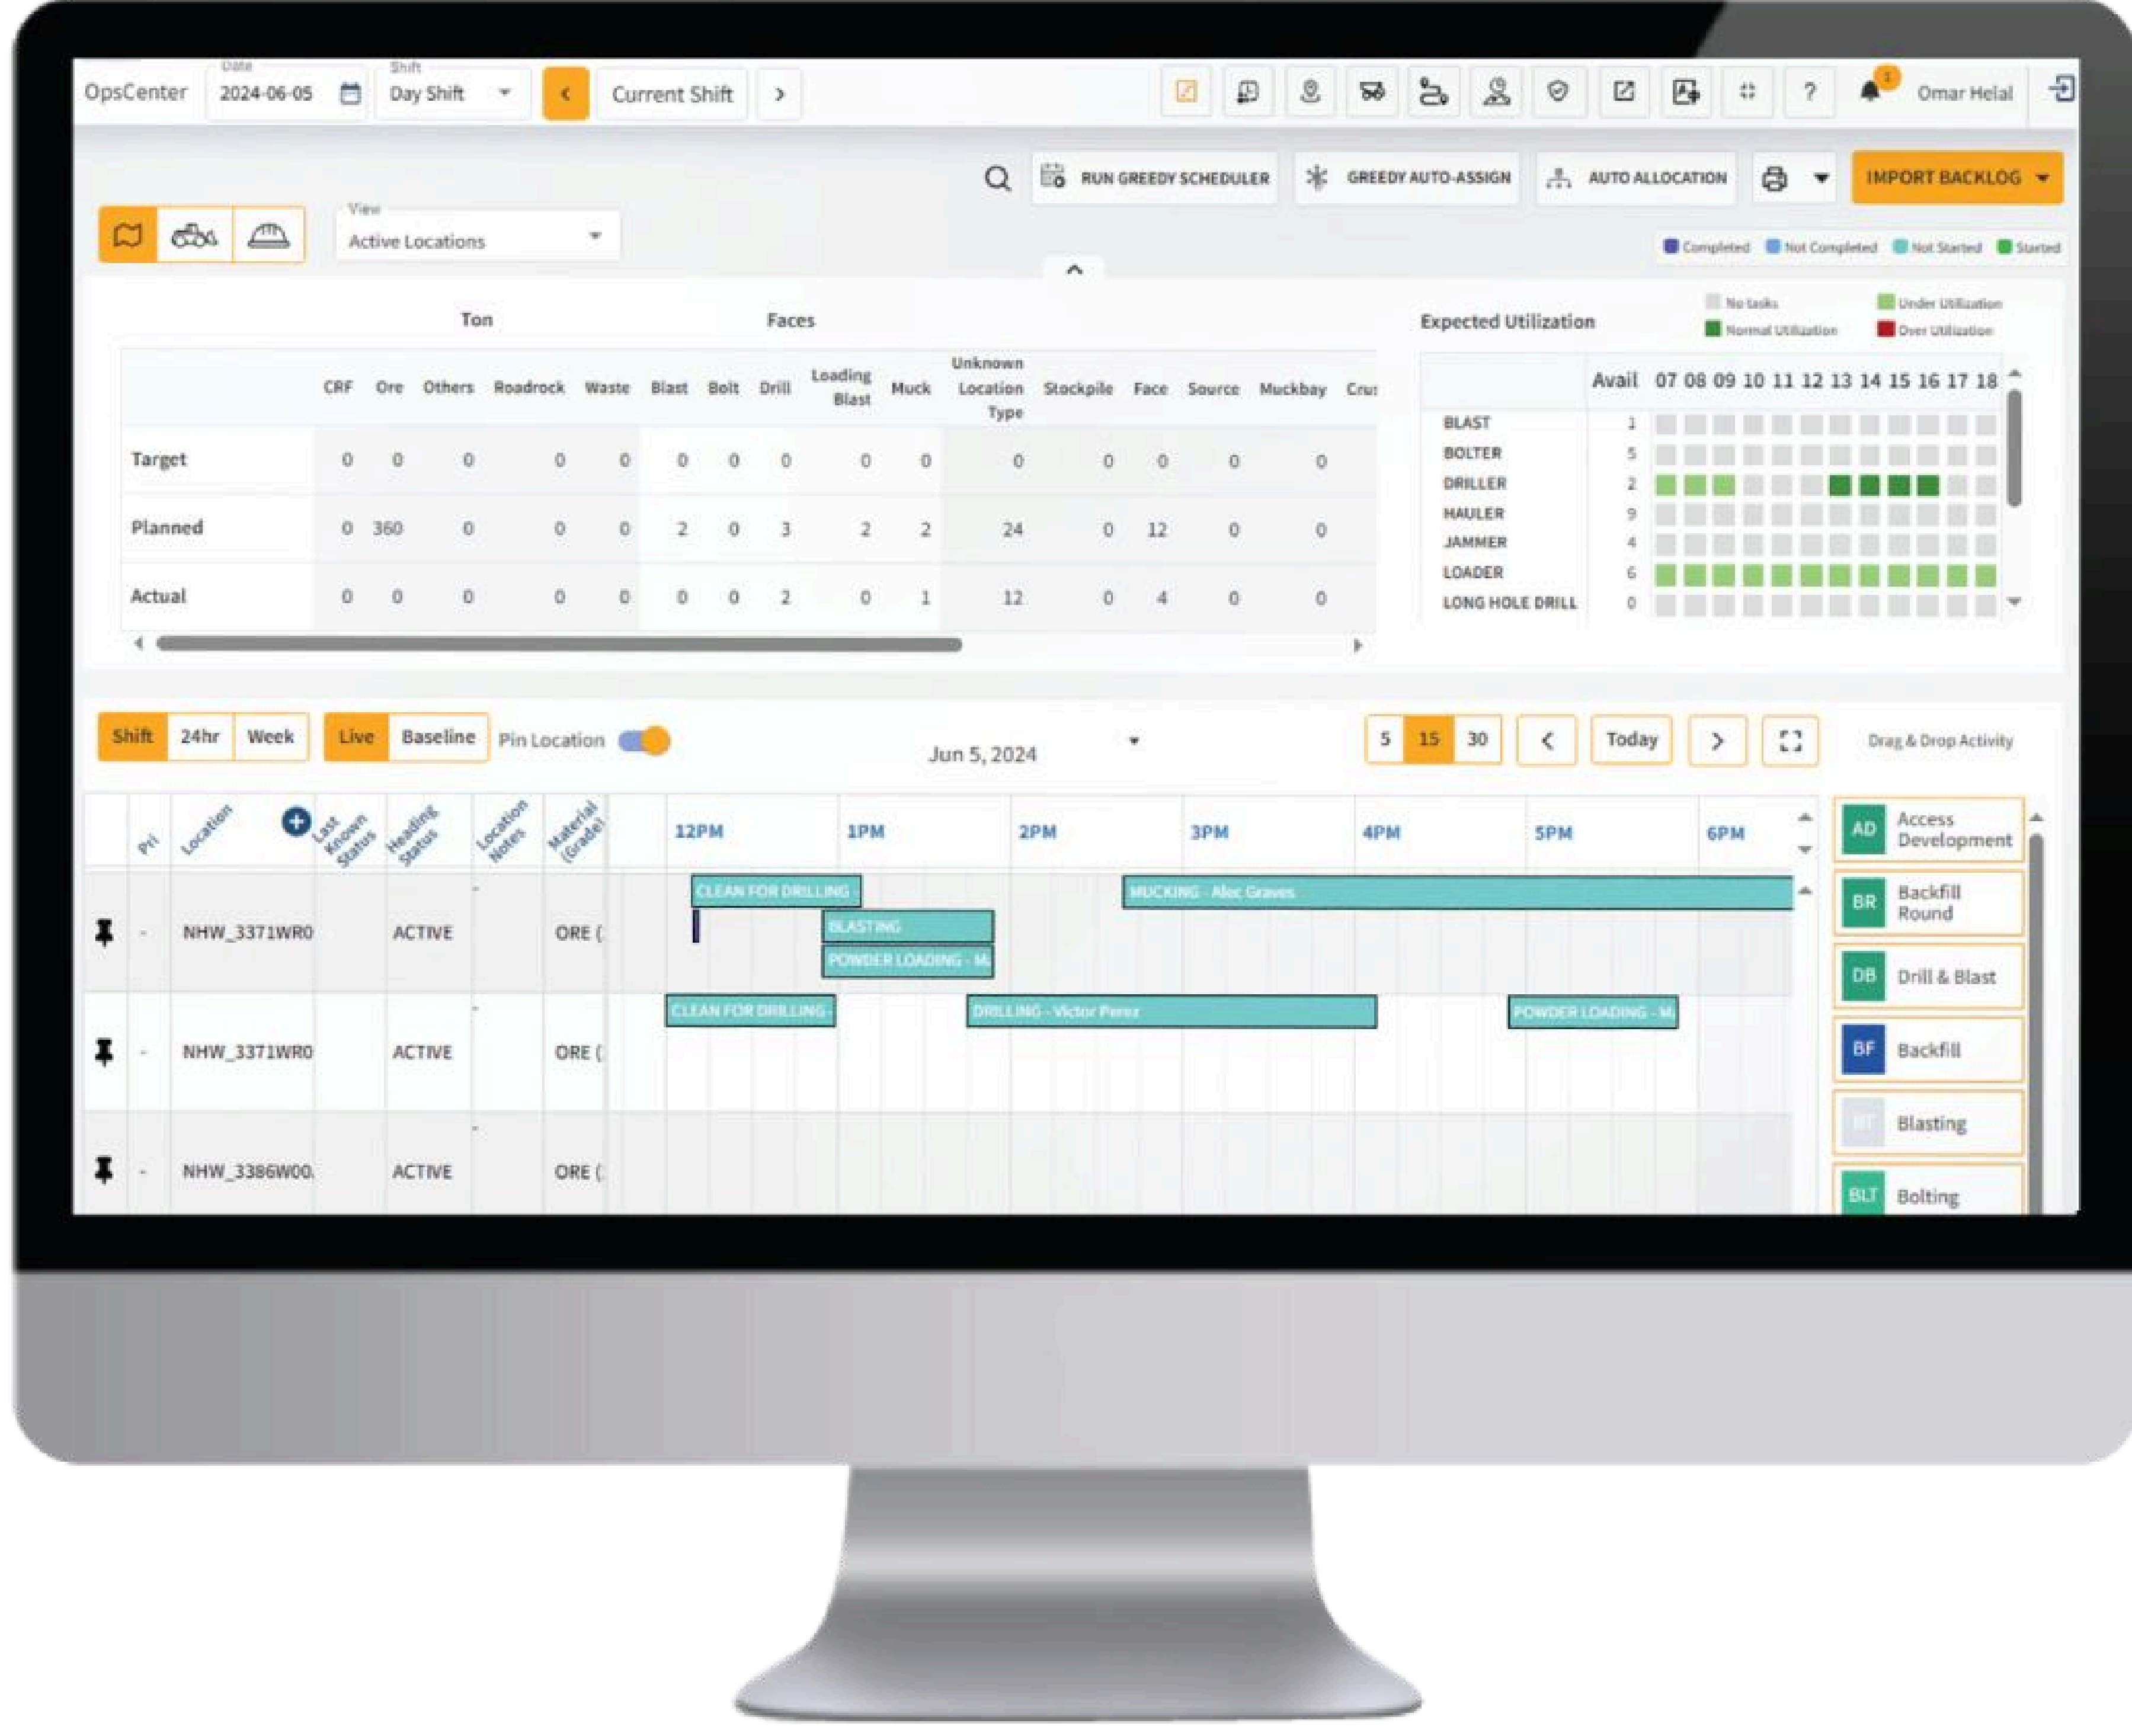

Madenin ihtiya larına g re, geliştirme d ng s ndeki g revler basit bir moloz toplama-delme-patlatma d ng s nden daha ayrıntılı bir yıkama-moloz toplama-civatalama-p sk rtme beton-delme- arj-patlatma s recine kadar  e itlenebilir. Madenin uygun g rd    temizlik g revleri de eklenebilir.

Bir  alı ma ba lı ını me gul edecek g revler eklemek kolaydır ve bu g revlerin izlenmesi gerekir. Bunlar arasında hizmet kurulumları,  l me i lemleri, jeolojik  alı malar ( rne in haritalama veya  rnekleme) ve jeoteknik g revler (denetim, kurulum ve testler) yer alabilir. Belirli bir ba lık i in t m faaliyetlerin planlanması ve programlanması, kaynakların tam kullanımını ve planlanmamı  durumların en aza indirilmesini hedefler.

Bakım programlarının entegrasyonu, bir vardiyada hangi ekipmanların ve başlıkların kullanılabilir olduėunu belirler. Bu, operasyon ve bakım birimleri arasında ekipman akışmalarını azaltır.

Vardiya programı tamamlandığında, görevler otomatik olarak ilgili personel ve ekipmanlara gönderilir. Görevler, konum, başlangıç zamanı, süre ve birimler gibi detaylarla tanımlanır. Görevi kabul edenler, madenin belirlediėi aralıklarda ilerlemelerini kaydedebilir. Bu bilgiler, süpervizr veya kontrol odasına ulaşır ve vardiya sırasında gerekli düzenlemeler yapılır. Böylece kaynak kullanımı optimize edilir ve vardiya hedefleri karşılanır veya aşılr. Görev tamamlandığında, operatr tamamlamayı resmi olarak kaydeder, tüketim malzemeleri gibi ölçmleri girer, başlıėın durumunu günceller ve bir sonraki göreve geçer. Süre tekrarlanır.

Başlıklara uygulanacak durumlar madene göre deėişir, ancak şunları ierebilir:

Alttan Oyulma Delme, Şarj ve Patlatma

Alttan oyulma kaldırıldığında, tüm faaliyetler ve görevler, gerekiyorsa vardiyanın dakikasına kadar ayrıntılı bir şekilde programlanabilir. Bu, planlanan hızda sütunların delinmesini, ekipman ve operatrlerin atanmasını, ardından şarj ve patlatma görevlerinin tamamlanmasını ierir.

ekme anı Delme, arjve Patlatma

Aynı ilkeler, ekme anlarının gelitirilmesinde de uygulanabilir. GroundHog'un gelitirme iin basit kullanımı, ekme anına veya noktasına eriim saęlar. Delme veya sondaj ilerlemesi, operatr veya makine girileriyle gerek zamanlı izlenir ve kaya koulları patlatıcılara iletilir. Ardından, GroundHog, alttan oyulma patlatmasının ilerlemesine gre arj grevlerini programlar ve kertme programına uygun patlatma yapar.

Zaman Modeli Girii

GroundHog, ekipman ve personel durumunu izleyerek madenin zaman modeline kolay eriim saęlar. Madenin zaman modeline gre, operatrler ekipman durumunu (rneęin, alıır veya arızalı) ve bakım birimine sorunları iletmek iin nceden tanımlı arıza kodlarını girebilir. Personel, madenin ihtiyalarına uygun nceden yapılandırılmış kodlarla durumlarını gncelleyebilir. Ekipman, personel, ekme noktası ve balık durumları, madenin kaynak kullanımının tam analizini mmkn kılar.

Jeoloji

- rnekleme
- Haritalama
- İzleme

Jeoteknik Grevler

- Denetim ve izleme
- Sensr kurulumu
- Kurulum
- Veri okuma

Başlık ve ekme Noktası Bakım Grevleri, İkincil Kıрма ve Acil Grevler

GroundHog, maden genelinde faaliyetleri izlemeyi kolaylaştırmak iin eşitli durum girişlerine olanak tanır. Operatr, spervizr veya kontrol odası girişlerine baėlı olarak, ekme noktalarının durumu řu řekilde etiketlenebilir:

- Akıřta
- Tıkalı
- İkincil kırma gerekiyor
- Tamir gerekli
- Tamir altında
- Jeolojik kontrol altında
- Kapalı
- Madenin belirlediėi diėer durumlar

Başlıklar iin benzer durumlar řunlar olabilir:

- Aık
- Manuel
- Yarı otonom
- Aık ekme noktalarının oranı
- Kapalı
- Jeolojik inceleme
- Tamir

Yukarıda belirtilen durumlarda, s perviz r tarafından ba latılmayan herhangi bir de i iklik, GroundHog aracılı ıyla  zelle tirilebilir bir uyarı  eklinde anında s perviz re iletilir. Bu, s perviz r n durumsal farkındalı ını artırmasını sa lar.

Sistem Ba ımsızlı ı

GroundHog, verilerin  evrimd  ı kaydedilmesini ve tablet WiFi veya ba ka bir ileti im a ına ba landı ında senkronize edilmesini sa lar. B ylece, GroundHog’u kullanmak i in ba lıklara pahalı WiFi a ları kurmaya gerek kalmaz. Bir y kleyicinin performans verilerini sisteme d zenli aktarması i in  ekme noktasında bir WiFi eri im noktası yeterlidir. Bu “a  olu turma ve tamponlama”  zelli i, gerilim  l erler veya sens r kabloları gibi kablosuz donanımlarla  alı an enstr mantasyon i in ileti im yolu sa lar. Bu, altyapı ihtiya ını ve ba lıkta kesintileri azaltır.

Yapay Zeka Tabanlı Programlama Optimizasyonu

Belirli bir optimizasyon ve ekipman etkinliĐi seviyesine ulaşıldığında, GroundHog, rota analizi ve erişim durumuna g re vardiya programını optimize edecek şekilde ayarlanabilir. Birden fazla y kleyici bir  ekme noktasına malzeme taşıyorsa, GroundHog, biri uzun mesafeli, diĐeri kısa mesafeli olacak şekilde programlar; bu,  ekme noktasında bekleme s resini azaltır.  ekme noktası atamaları  nceliklendirilir ve otomatik programlanır. Maden, bekleme s relerini  nceliklendirmemeyi se erse, programlama sabit bir kalite hedefi, maksimum tonaj veya kullanım i in optimize edilebilir. GroundHog, ekipmanın aşırı veya az kullanıldığını tespit ederek uyarı verebilir veya ek g rev gibi   z mler  nerebilir.

    nc  Taraf Yazılımlarla Entegrasyon

GroundHog, veri y netim sistemleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları, uzun vadeli programlayıcılar ve jeoloji yazılımlarıyla kolayca entegre olur. Mevcut Filo Y netim Sistemi ile tam uyumlu  alıřabilir ve ek  zellikler sunarak maliyet etkin bir   z m saĐlar. Ayrıca, ekipman  reticilerinin yerleşik sistemleriyle entegre olarak izleme ve analiz platformu olarak kullanılabilir.

AeroScout ve Mobilaris gibi konumlama yazılım paketleri, GroundHog ile çoklu amaçlar için kolaylıkla entegre edilebilir. Operatör veri girişleri, örneğin çekme noktasına taşınan kova sayıları gibi görev sayımları için doğrulanabilir. Operatör tarafından girilen her kova sayımının zaman damgası, operatörün göreceli konumuyla çapraz referanslanabilir. Eğer bu konum, çekme noktasına geçerli bir mesafede değilse, verilerin kontrol edilmesi gerektiğini belirten bir uyarı işaretlenebilir. Konumlama yazılımındaki coğrafi çitleme özelliği, coğrafi olarak sınırlandırılmış (kapalı) alanlara atanan görevler için uyarı veya işaretleme yeteneği sağlar. Blok kütle çökertme operasyonlarında yoğun olarak kullanılsa da, GroundHog, yığın yönetimi ve tonaj takibi gibi ek özellikler sunar. Üretim jeolojisi veritabanlarıyla entegrasyon sayesinde, tonaj ve yığınların kalite derecesi de erişilebilir hale getirilebilir.

GroundHog Kullanımının Sonuçları

Ekipman Kullanımının Artması

Kısa Aralık Kontrolü, her ekipmanın ne yapması gerektiği ve ne yaptığı hakkında farklı formatlarda basit görselleştirmeler sunarak ekipman kullanımını optimize eder. Gelecekteki planlamalar için düzenlemeler yapılabilir. Ekipmanların sabit maliyetleri daha fazla tonaja dağıtılır.

Personel Verimliliğinin Artması

Kısa Aralık Kontrolü, yeraltındaki personelin faaliyetlerini planlama, programlama ve izleme imkânı sağlar. Her operatörün vardiya boyunca ne yapması gerektiği basit görselleştirmelerle gösterilir. Böylece, tüm operatörlerin vardiya süresince belirli görevlerle tam ve sürekli meşgul olması sağlanır. Operatörlerin geçmiş faaliyetleri görselleştirilerek, üretkenliği artırmak için disiplin veya eğitim yoluyla düzeltici eylemler alınabilir ve ekip genelinde standartlar yükseltilir.

Operat rlerin neler yaptığına dair basit g rselle tirmeler sayesinde,  retkenliğı artırmak ve ekip genelinde standartları y kseltmek i in disiplin veya eđitim yoluyla d zeltici eylemler ger ekle tirilebilir.

Sermaye Maliyetlerinin Azalması

Ekipmanların teknik sınırlarına daha yakın  alı abilmesi,  retim hedeflerini kar ılamak i in ek ekipman ihtiyacını ortadan kaldırır ve sermaye maliyetlerini d    r r.

İ letme Maliyetlerinin Azalması

Kısa Aralık Kontrol , birden fazla fakt r  etkileyerek i letme maliyetlerini azaltır. Daha fazla tonaj  retimi, i  ilik, enerji ve ekipman sahipliğı gibi sabit maliyetlerin daha fazla tonaja b l nmesini sađlar. Bu, ton ba ına maliyeti d    r r. Ekipman kullanımı optimize edildiğinde, bazı ekipmanlar yedekte tutulabilir, kullanıma hazır hale getirilebilir veya satın alımları ertelenebilir.

İleti imin Artması

GroundHog, vardiya sırasında operat rler, s perviz rler ve kontrol odası arasında ileti imi g  lendiren bir platform sađlar. Bu, daha y ksek  retkenlik ve kullanım oranıyla sonu lanır. Ayrıca, ger ek zamanlı ve vardiya sonrası raporlamalar i in kolay bir veri kaynağı sunar.

Veri Akı ının İyile mesi

Artan ileti im, daha iyi ve denetlenebilir bir veri akı ı sađlar. Anahtar performans g stergeleri (KPI'lar), ger ek zamanlı ve vardiya sonrası izleme i in daha eri ilebilir olur. Daha fazla ve  e itli veri toplanabilir ve analiz edilebilir.


Veri Doğruluğunun Artması

Veri doğruluğu kontrolleri, veri kaynağına daha yakın bir şekilde kolayca uygulanabilir ve gerektiğinde yalnızca en  nemli bilgilerin iletilmesi i in veri miktarı azaltılabilir.

Proje Geri D n   n n Artması

Azalan sermaye ve i letme maliyetleri, artan  retkenlik ve kısalan proje geliştirme s resi, hangi y ntemle hesaplanırsa hesaplansın, proje geri d n   n  artırır.

GroundHog SIC ve Filo Y netim Sistemi:  rnek Aray zler

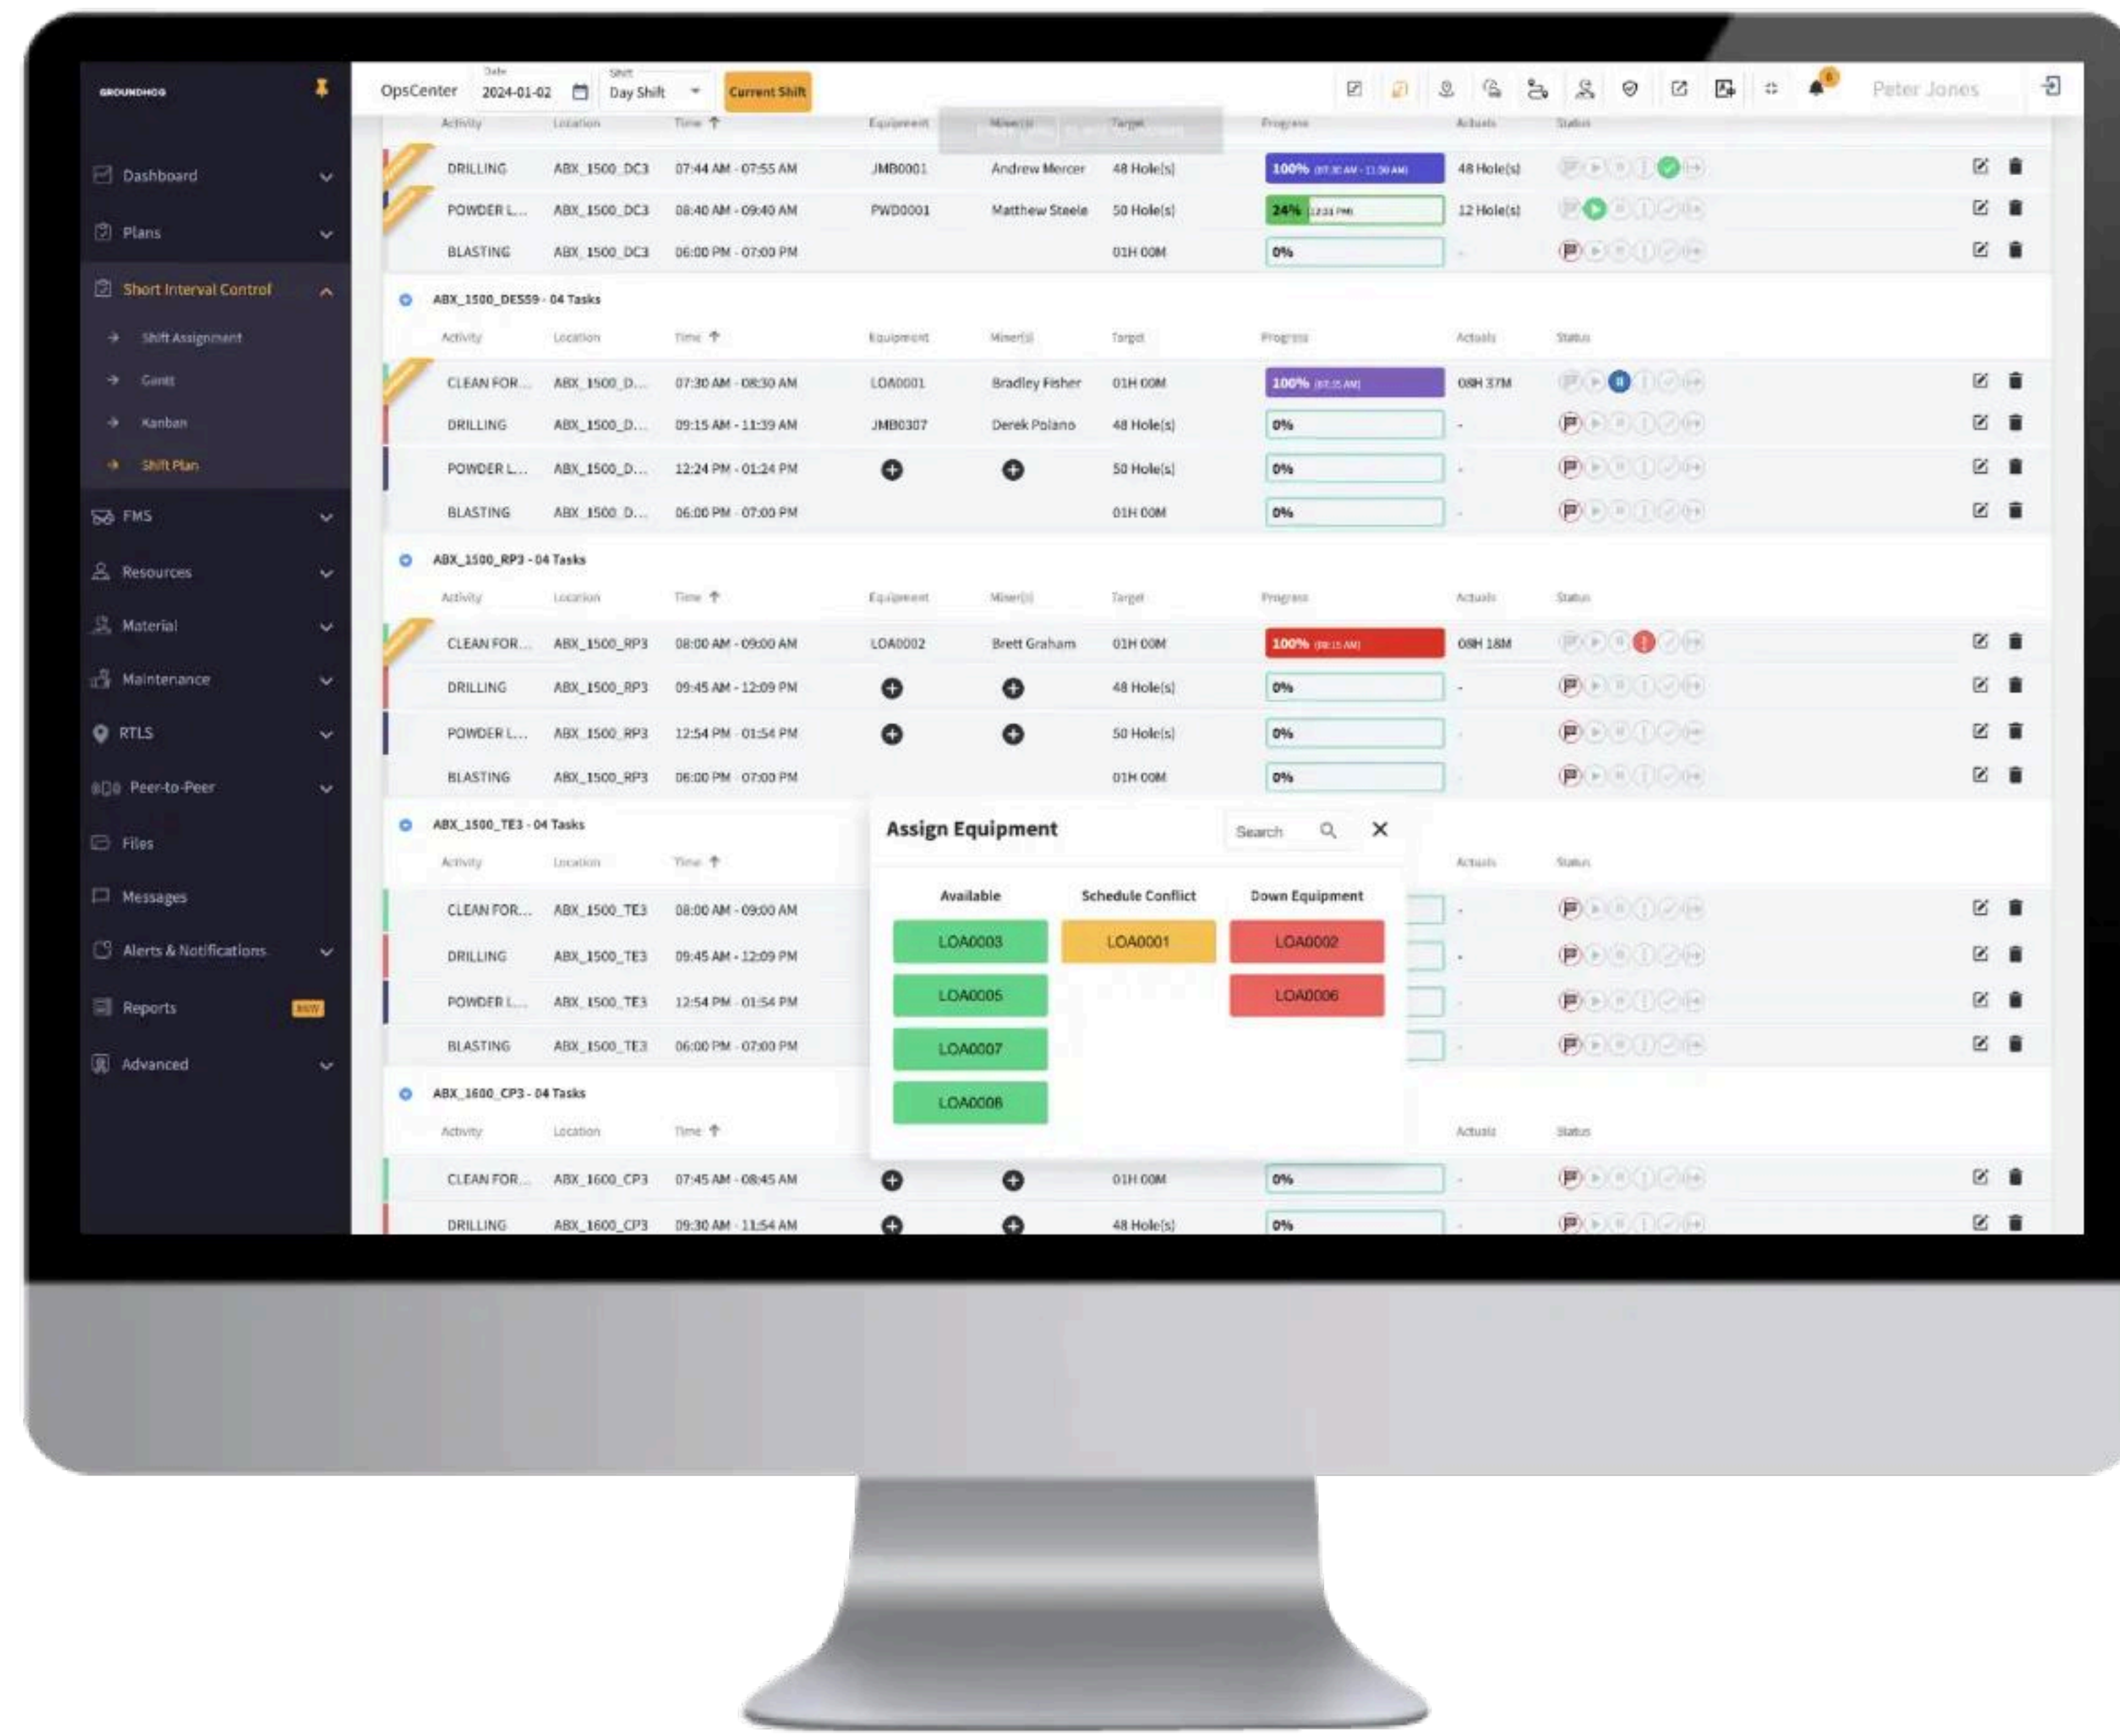


Otomatik Vardiya Atama

Shift Summary						
2024-01-22 NS						
Current Time : 11:05 PM						
Next Refresh In 10:00						
BOLTING						
Operator	Equipment	Location	Start	End	Count	
Dan Sapp	BLT0002	65SL INCLINE	2024-Jan-22 11:04 PM		38	
Steph C Operator	BLT0001	ABX_1500_DESS9	2024-Jan-22 07:20 PM	2024-Jan-22 09:20 PM	15	
CLEAN FOR DRILLING						
Operator	Equipment	Location	Start	End	Count	
Bradley Fisher	LOA0001	1600BCQ_1600_RE3	2024-Jan-22 07:35 PM	2024-Jan-22 08:00 PM		
Brett Graham	LOA0008	ABM_2145_MB02	2024-Jan-22 07:26 PM	2024-Jan-22 08:03 PM		
Charles Cummings	LOA0002	2950_ESC1_	2024-Jan-22 10:02 PM	2024-Jan-22 11:03 PM		
Nathaniei Long	LOA0007	ABX_1500_MB01	2024-Jan-22 11:05 PM			
DRILLING						
Operator	Equipment	Location	Start	End	Drill Advance	Count
Andrew Mercer	JMB0306	1600BCQ_1600_RE3	2024-Jan-22 06:50 PM	2024-Jan-22 10:00 PM	12	15
Daniel Barr	JMB0307	ABM_2145_MB02	2024-Jan-22 06:26 PM	2024-Jan-22 09:45 PM	10	16
Thomas Castillo	LSG-8080	2950_ESC1_	2024-Jan-22 11:03 PM		0	29
Willie Haney	JMB0002	ABX_1500_MB01			0	
MUCKING						
Operator	Equipment	Location	Start	End	Count	
Brett Graham	LOA0008	ABX_1500_DC1	2024-Jan-22 07:30 PM	2024-Jan-22 10:45 PM	51	
James Cameron	LOA0003	ABX_1500_DESS9	2024-Jan-22 08:50 PM	2024-Jan-22 10:50 PM	21	
Johnny Carey	LOA0005	2950_ESC1_				
Joshua Bates	LOA0008	ABX_1500_MB01				
POWDER LOADING						
Operator	Equipment	Location	Start	End	Count	
Dan Sapp	PWD0001	1600BCQ_1600_RE3	2024-Jan-22 10:05 PM	2024-Jan-22 10:30 PM	15	
Derek Polano	PWD0002	ABM_2145_MB02	2024-Jan-22 10:00 PM	2024-Jan-22 10:30 PM	16	
Johnny Carey	PWD0001	2950_ESC1_				
Nicholas Miles	PWD0002	ABX_1500_MB01				


G rev Dağıtımı ve İletişim

OpsCenter						
Location Preference						
English						
Peter Jones						
Generate Actuals Report						
Export to Deswik						
Import from Deswik						
*Note: We import files and store them.						
Weekly						
	03 Sep 2022 Sat	04 Sep 2022 Sun	05 Sep 2022 Mon	Plan	Scheduled	
3RD_HAUL_OGA3	-	-	-	-	-	-
3RD_HAUL_MB01	-	-	-	-	-	-
BBT_2790HA001	9.00	9.00	9.00	56.50	-	-
BBT_2843_A007	6.00	0.64	12.00	53.80	-	-
BBT_2843_A009	0.63	-	-	0.63	-	-
BBT_2843_B001	7.50	4.85	9.00	52.61	8.00	8.00
BBT_2843_BF02	2.44	11.36	-	23.36	8.00	8.00
BBT_2953VL012	8.00	8.00	8.00	52.00	8.00	8.00
BBT_3078NL001	8.25	8.25	8.25	26.58	-	-
BBT_3078NL015	5.80	-	2.86	11.11	8.00	8.00
CTR_2985S00D1	-	-	-	-	-	-
FED_2641_C009	4.50	9.00	3.92	41.39	8.00	8.00


Haftalık Planın İ e Aktarılması

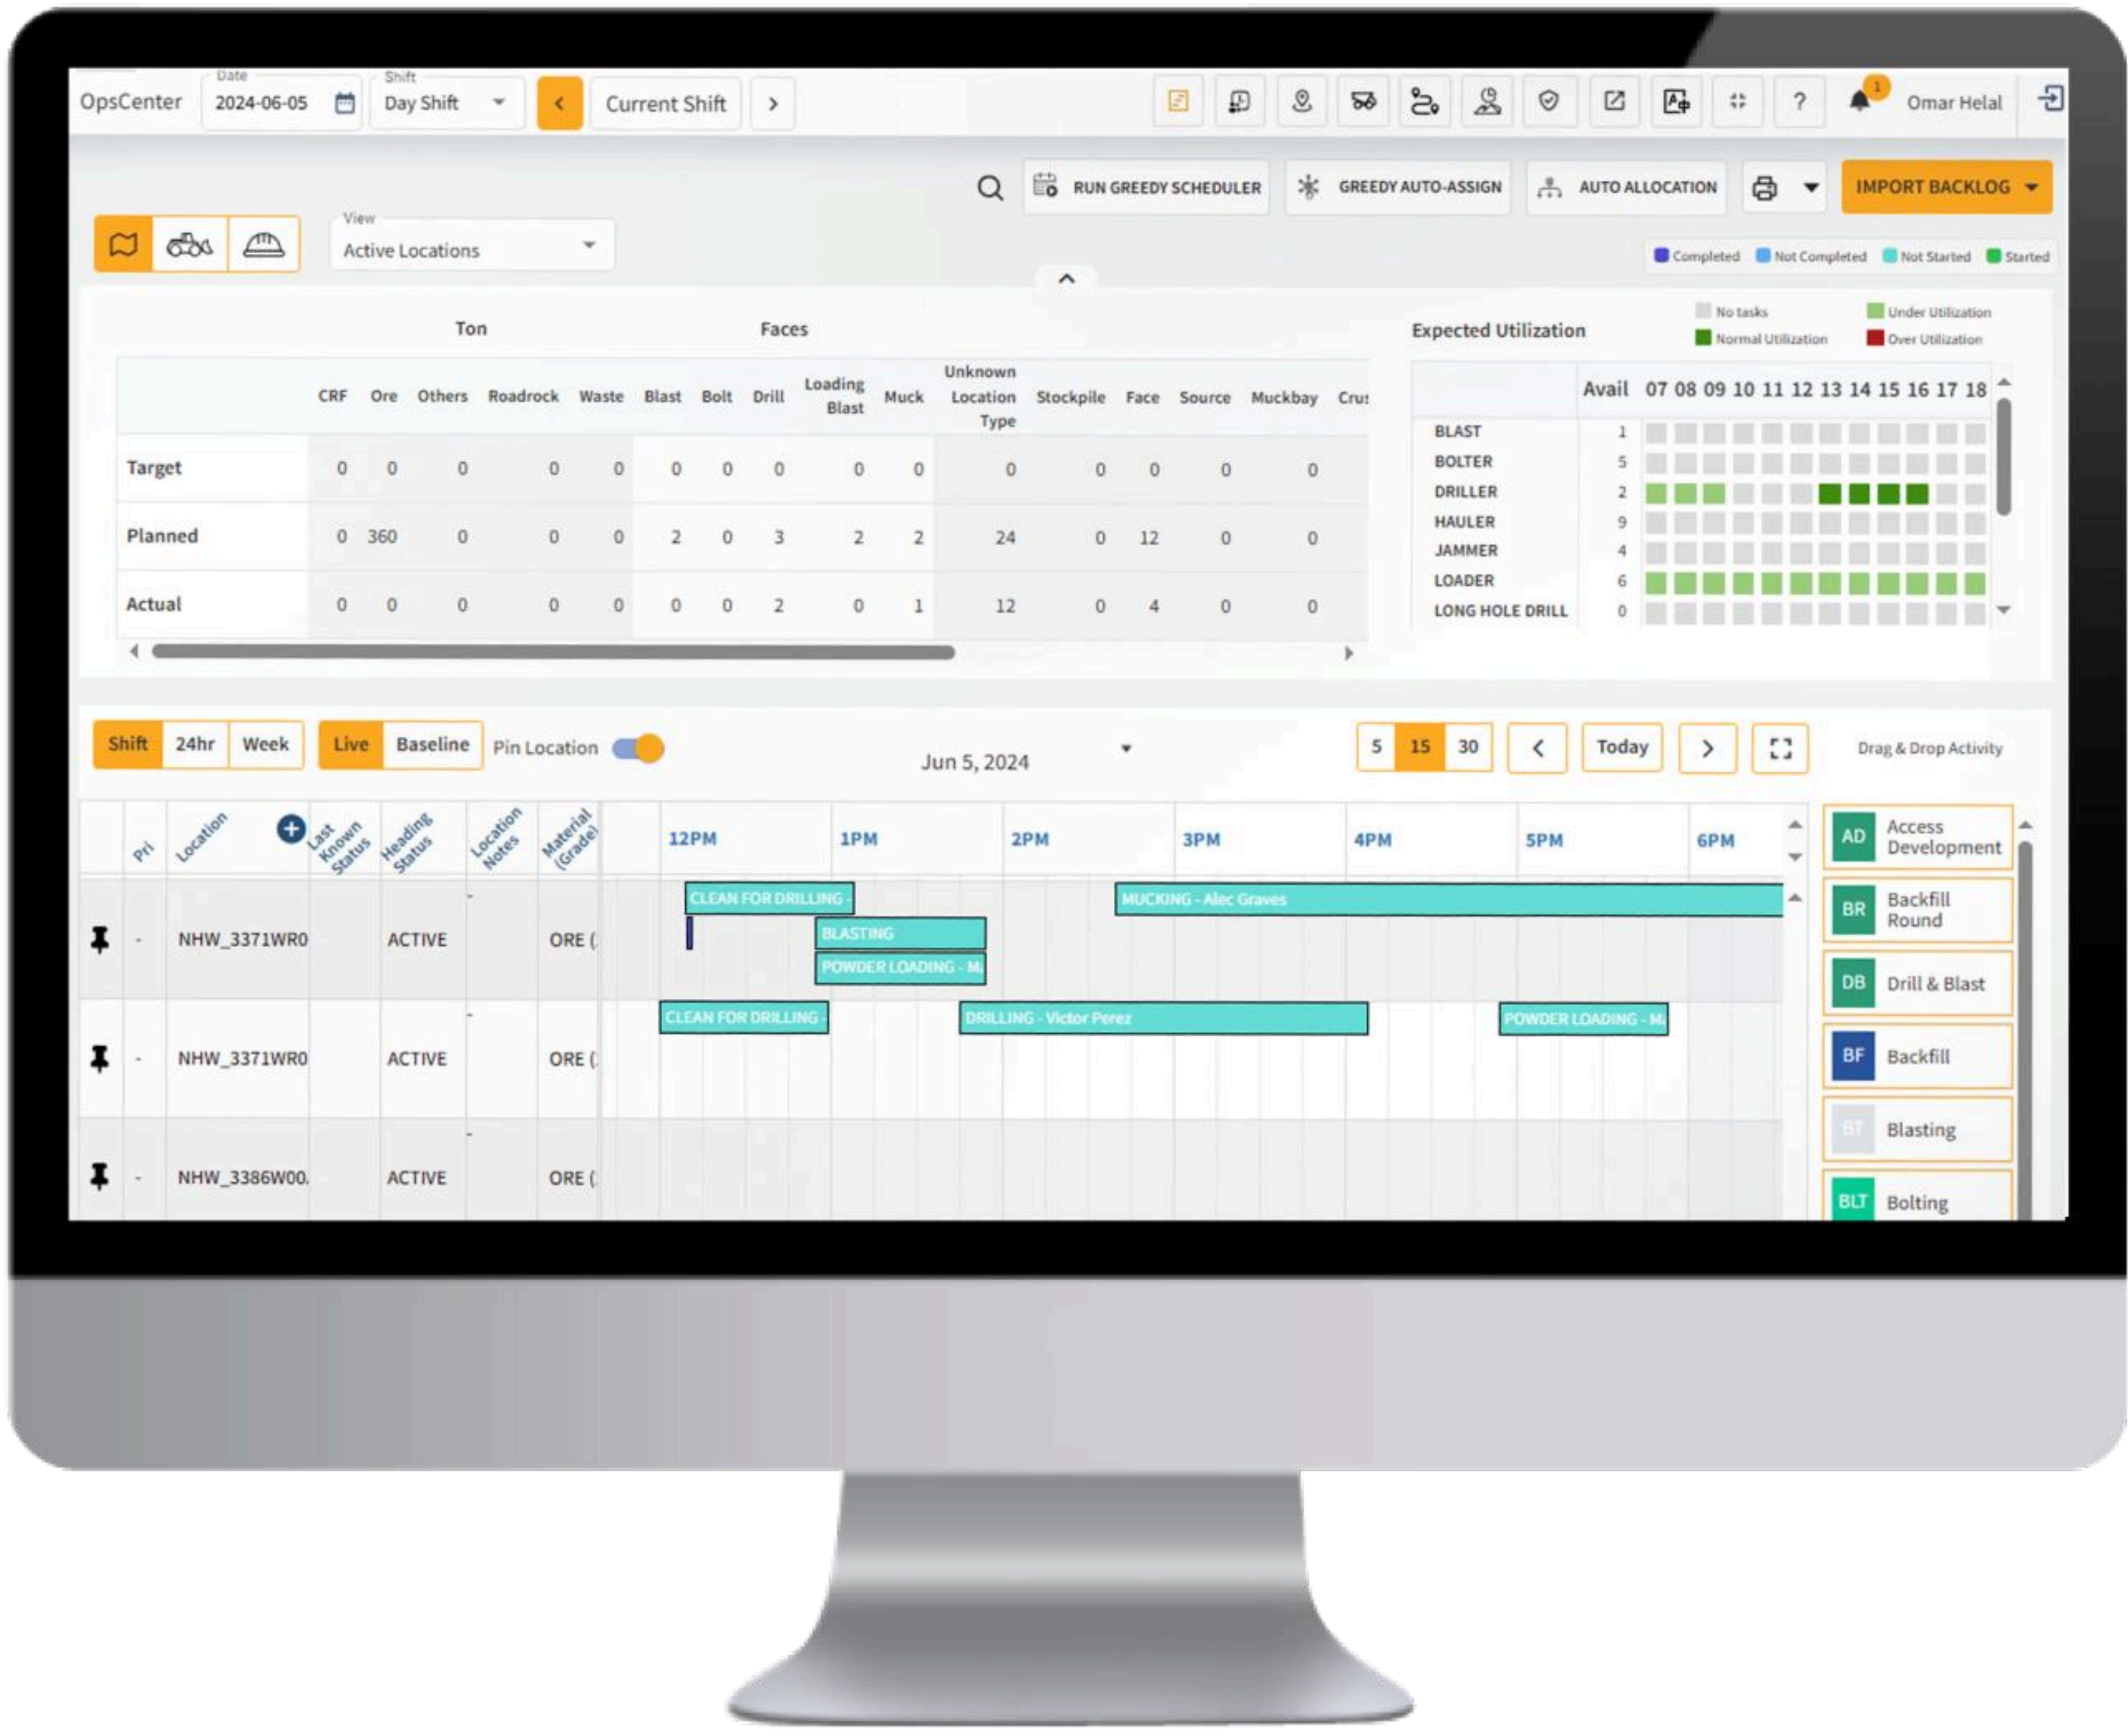


Kullanıcı Dostu S r kle-Bırak Aray z 

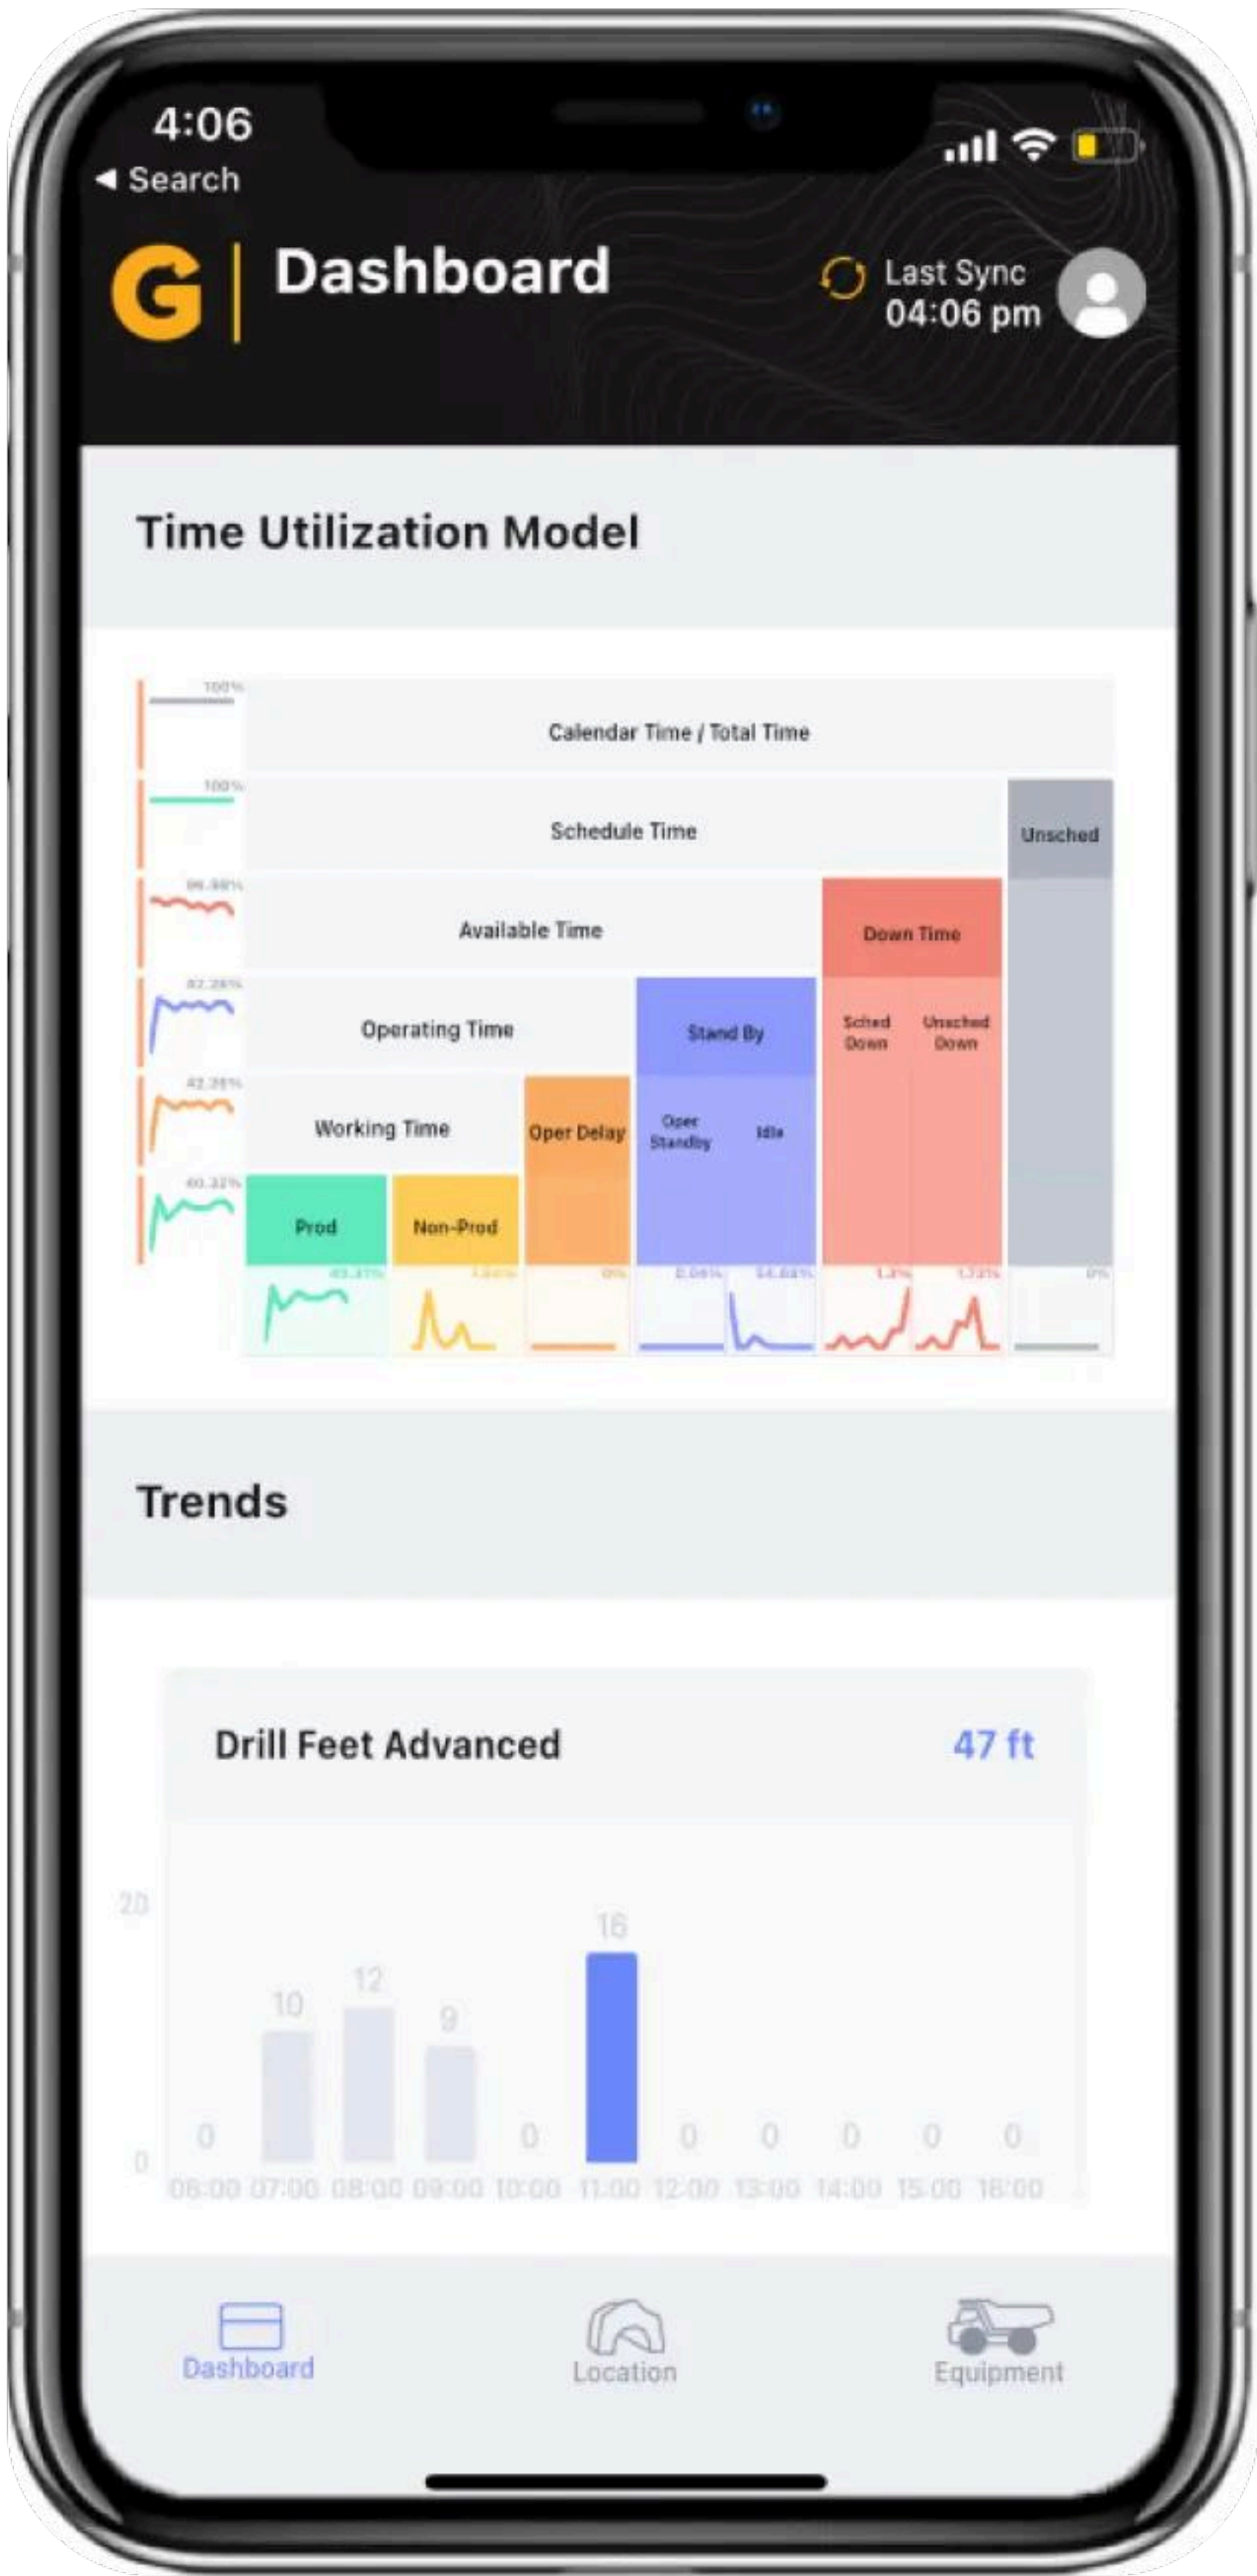

Otomatik Vardiya Kayıtlarıve Raporlar

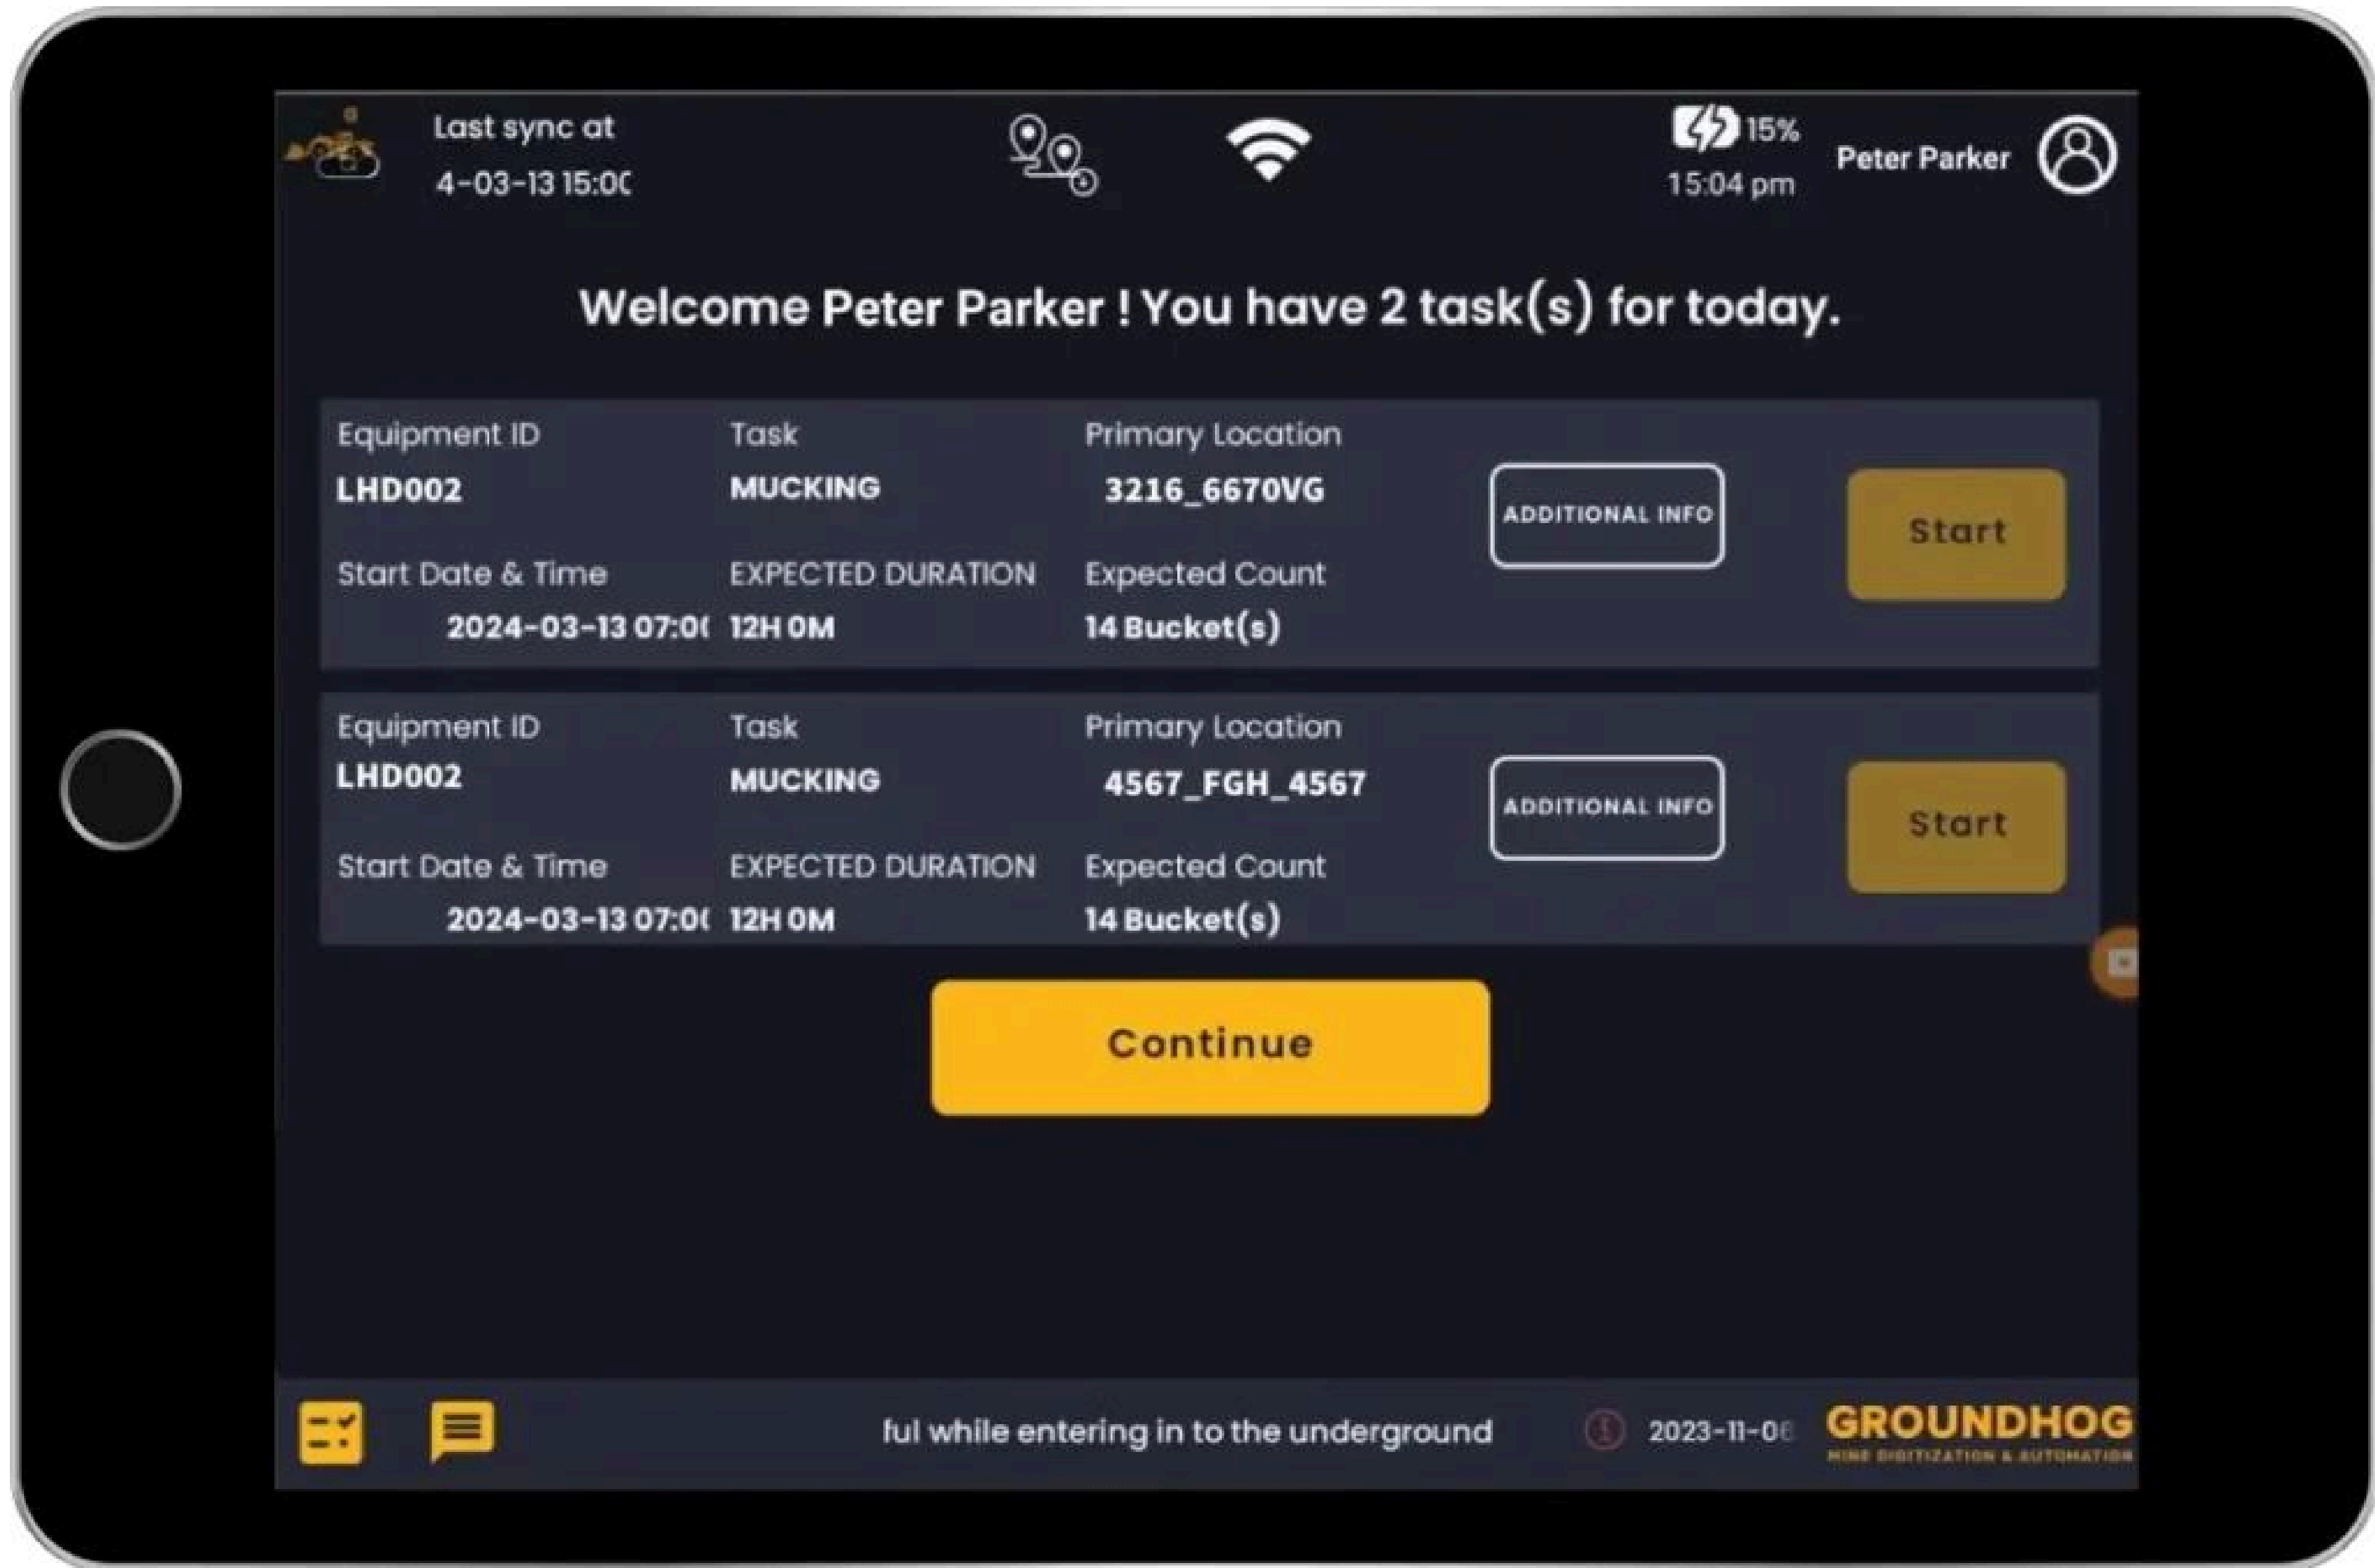

Tabletle Grev Alma

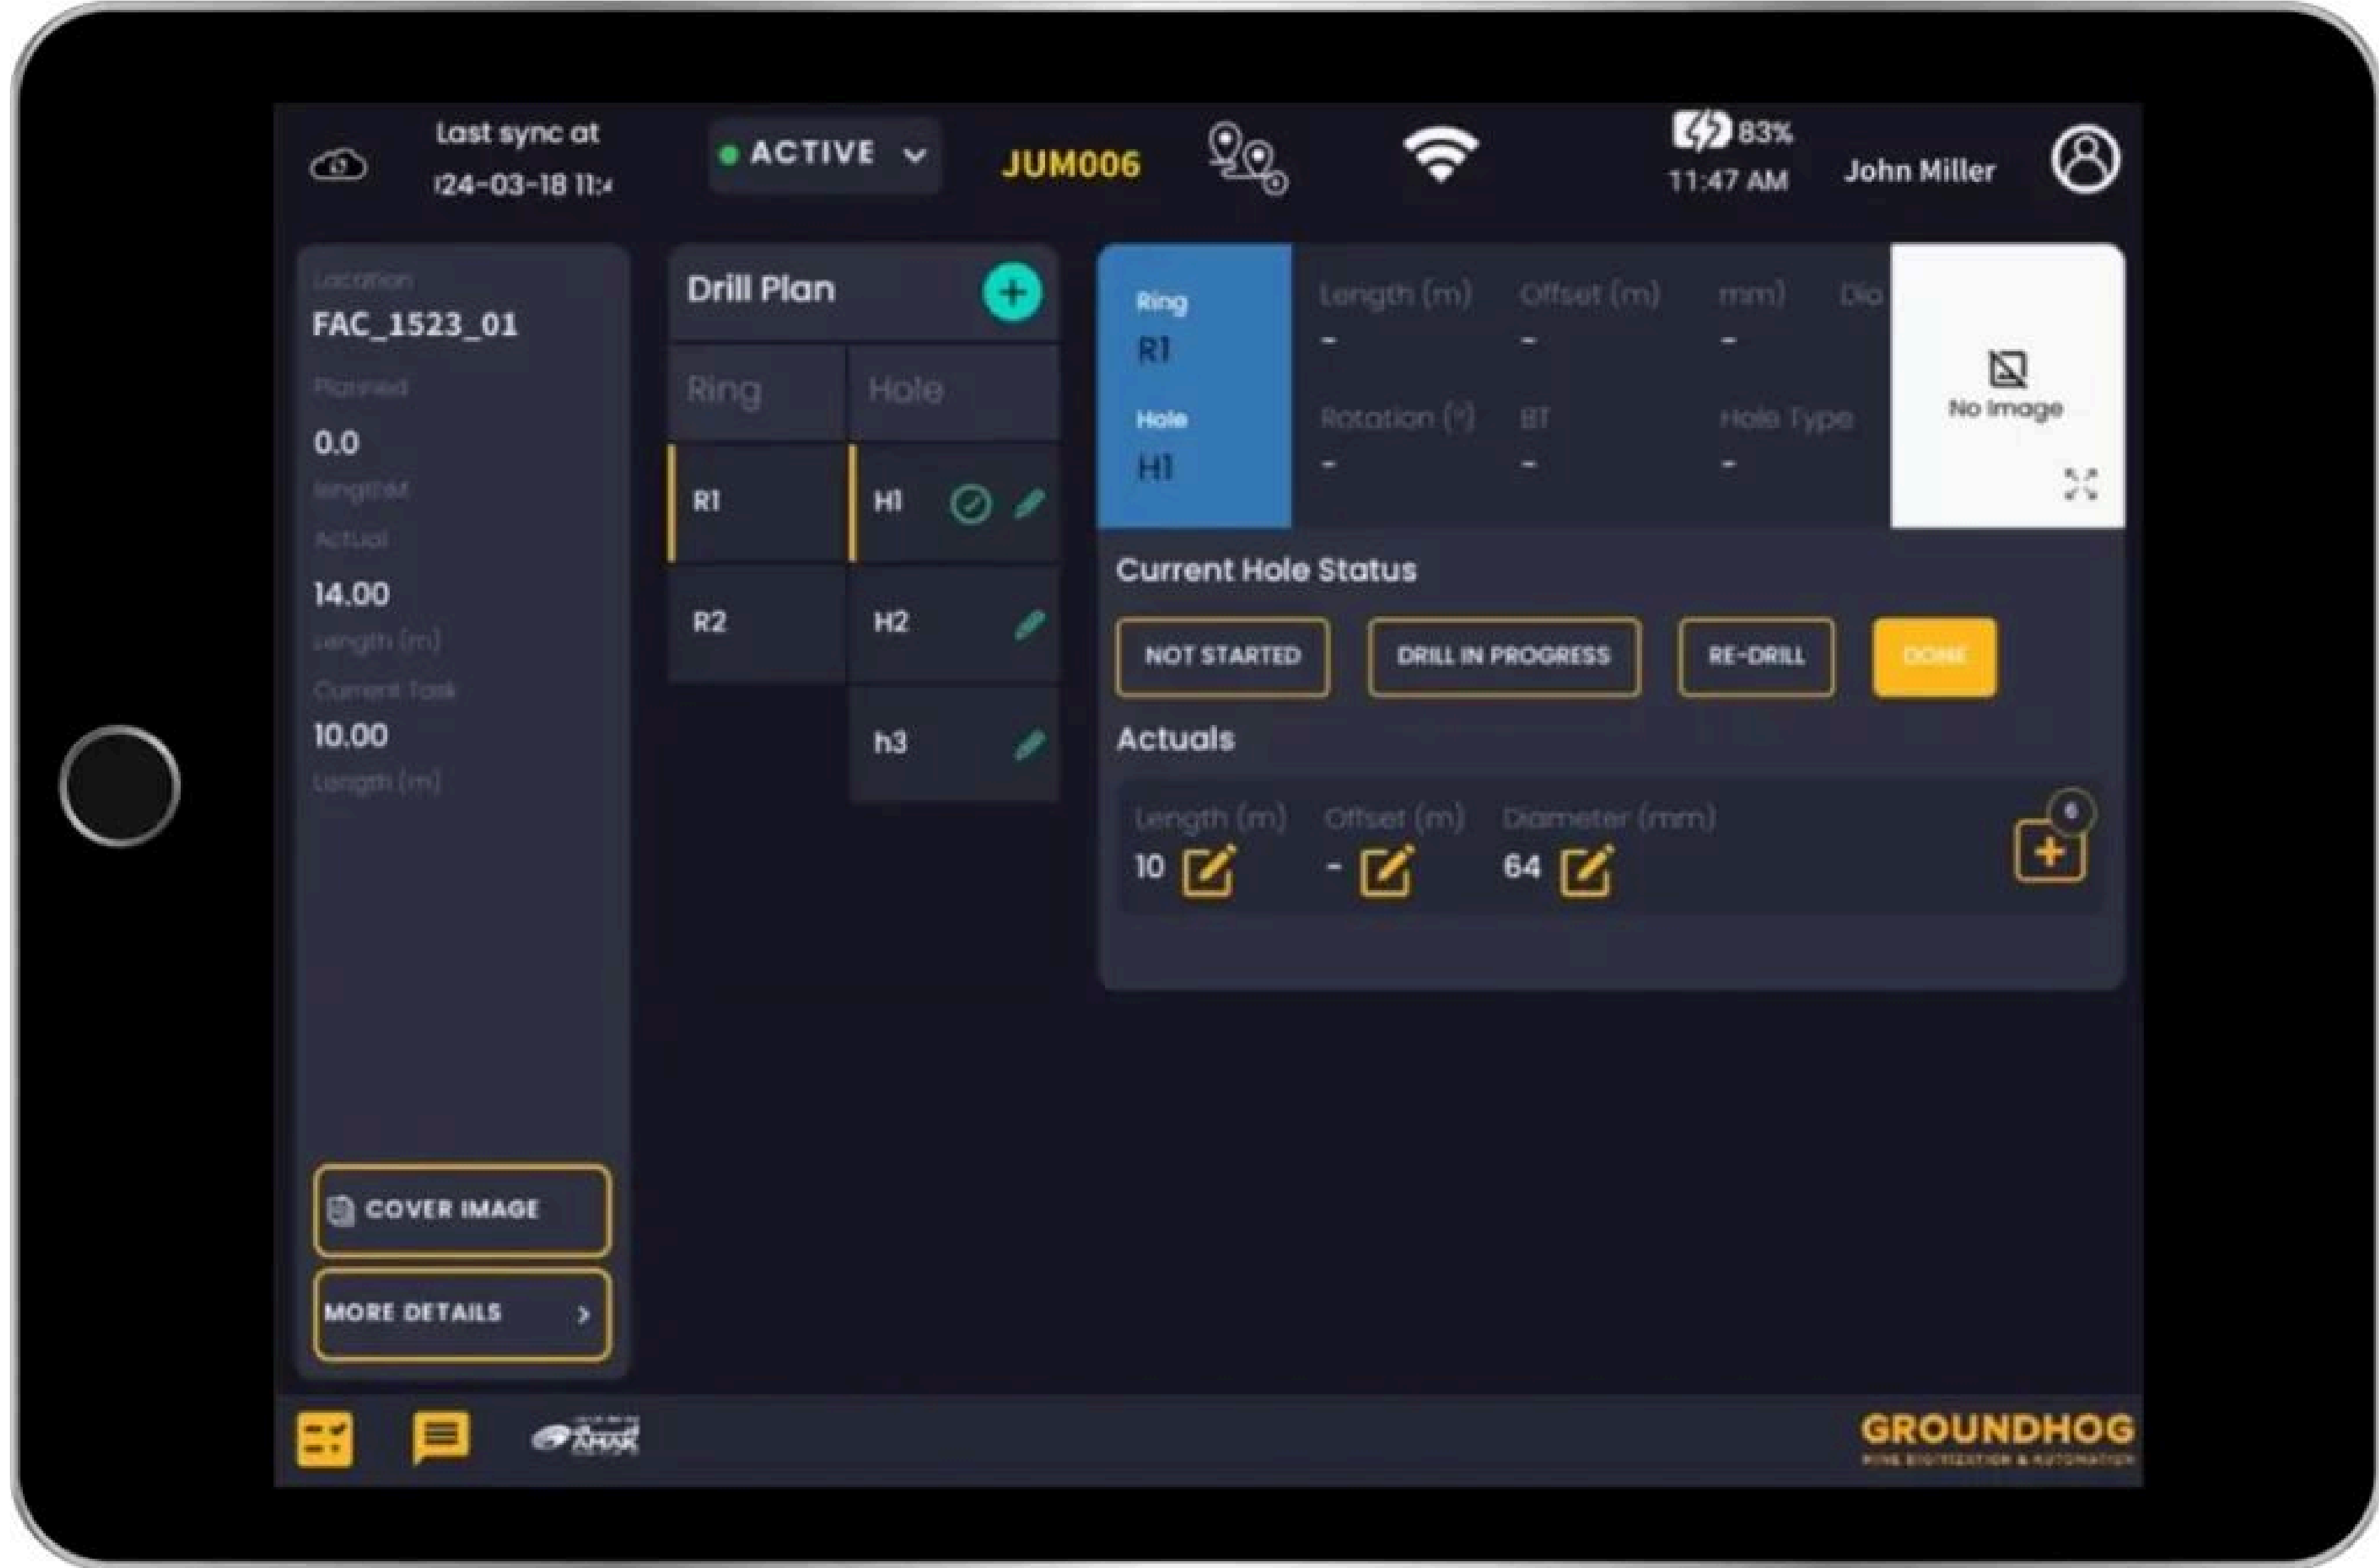

retim Faaliyetleri

Sonuç

Madencilik sektr, gl ters rzgrlara karşı yeniden yapılandırılıyor. Şirketler krlılıęı yeniden inşa etmeye alışırken, retkenlik iyileştirmeleri ncelikli hedefler arasında yer alıyor. Dijital teknoloji, madencilik operasyonlarının temel unsurlarını dnştrerek nemli ekonomik deęer sunma potansiyeline sahip. Bu baęlamda, Kısa Aralık Kontrol, madencilik sektrnde operasyonel mkemmeliyete ulaşımda kritik bir rol oynayacaktır. Madencilik şirketlerinin, sre verimlilięini artıran ve varlık kullanımını iyileştiren yeniliki bir kısa aralık kontrol sistemine yatırım yapması byk nem taşıır.

GroundHog Hakkında

GroundHog, yeraltı ve a ık ocak madenciliđi ortamlarında  retkenlik, verimlilik ve g venliđi artıran g  l  dijital   z mler sunarak madenlerin i leyi ini yeniden tanımlıyor. Madencilik teknolojisinde  nc  olarak, yenilik i yazılımlar aracılıđıyla madenleri daha akıllı, g venli ve verimli operasyonlara d n  t rmeye kararlıyız.

GroundHog, modern madenlerin kar ıla tıđı benzersiz zorlukları   zmeye odaklanır. Kısa Aralık Kontrol  (SIC) ve Filo Y netim Sistemi (FMS) gibi amiral gemisi  r nlerimiz, operasyonun her y n ne ger ek zamanlı g r n rl k ve kontrol sađlar. Filo hareketlerini hassas sens rlerle izlemekten  retimi y netmeye ve ekipman kullanımını optimize etmeye kadar, yazılımlarımız karma ık verileri eyleme d n  t r lebilir bilgilere  evirir. Bu, m   terilerimizin  retkenliđi artıran ve operasyonel kesintileri azaltan bilin li kararlar almasını sađlar.



groundhogApps.com

YAYINLAYAN:
GroundHog
